



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres - Colombia

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Certificado No. SG 2015001782 (A - B - F - H)

BALANCE OPERACIÓN MOCOCA

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL
Marzo 31 de 2017 /11:24p.m

MUNICIPIO DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

14 DE NOVIEMBRE DE 2017

EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.



MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde
- Decreto No. 172 del 05 de septiembre de 2017 mediante el cual se prorroga el Decreto 056 por seis meses, a partir del 1 de octubre



PERSONAS

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Heridos | 398 |
| Fallecidos* | 333 |
| Cuerpos Entregados a las Familias | 300 |
| Desaparecidos | 76 |
| Familias Registradas en el RUD | 7.892 |
| Personas Registradas en el RUD | 22.317 |

INFRAESTRUCTURA

| | |
|-----------------------|-------|
| Barrios Afectados | 48 |
| Subestación Eléctrica | 1 |
| Acueductos | 2 |
| Red de Gas | 1 |
| Kilómetros de Vías | 11.58 |
| Puentes Destruídos | 2 |
| Puentes Averidos | 3 |
| Viviendas Afectadas | 1.462 |
| Hectáreas Rurales | 486,3 |

* Fuente: Medicina Legal

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas

95 Reuniones Realizadas

Miembros del SNGRD que operaron

Más de 2.300

Personas Atendidas en los Puesto de Información

Más de 10.000

ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina) Incluidas las Donaciones de la Primera Dama, Empresas Privadas y Comunidad

2.540 Toneladas Entregadas

APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados

297

FASE DE RESPUESTA

100%

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN



SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela)

57.945

Vacunas Aplicadas Animales

1.639

ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional

100%

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos

100%



Asistencia Humanitaria de Emergencia

AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados

Más de 102 millones

Litros de Agua Entregados por Día

1 millón

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

Hoy 5 Carrotanques se encuentran disponibles, de los cuales 2 continúan en operación.

ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los
Albergues

4.561

Albergues que fueron
Habilitados y
Administrados

9

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados

5.648

**Valor Subsidios: \$10.200 millones
Hasta junio de 2018**

FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%
90 días



Transporte y traslados

Personas que fueron trasladadas a otras
ciudades con el apoyo de Cancillería y
OIM

765

MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

Se utilizaron 49.220 Horas Máquina para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

Hoy se cuenta 7 Maquinas como contingencia

INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA

CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños **2.056**

Jornadas Socioculturales **61**

AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente) **1**

AGUA

Bocatomas en Rehabilitación **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable (Suroccidente, Barrios Unidos y Norte) **3**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro) **1**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-MinVivienda, Logística- Ejército Nacional

EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**

NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y Madres Gestantes **47 Toneladas entregadas**

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de Escombros, Manejo de Maquinaria,) **270**



INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL GOBIERNO NACIONAL PERMANENTE EN MOCOA – OGN

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD

Cuenta Davivienda No. **021666888**

| | |
|--|-----------------------------|
| Donaciones Nacionales | \$9.948.446.159,06 |
| Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior | \$ 27.049.803.655,89 |
| TOTAL | \$ 36.998.249.814,95 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CHINA | \$ 2.854.900.000 |
| EMIRATOS ARABES | \$ 19.690.929.675 |
| TURQUÍA | \$ 430.250.000 |
| BANCO CENTROAMERICANO | \$ 569.200.000 |
| BID | \$ 718.375.000 |
| CAF | \$ 285.765.000 |
| KEYCOFFEE | \$ 26.378.087 |
| MITSUBISHI | \$ 131.890.436 |
| KEIMYUNG CARITAS (SOUTH KOREA) | \$ 12.840.994 |
| DINAMARCA | \$ 130.434.782 |
| BOOYOUNG HOUSING CO LTD (SOUTH KOREA) | \$ 294.796.029 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| LIG NEX1 CO.,LTD. | \$ 59.340.000 |
| TAILANDIA | \$ 292.820.000 |
| GIFU BROADCASTING | \$ 2.641.578 |
| COREA | \$ 871.950.000 |
| WORLD TRADE ORGANIZATION | \$ 9.460.390 |
| HYUNDAI | \$ 293.170.000 |
| COLOMBIANOS EN ALEMANIA | \$ 8.071.446 |
| PERSONAS EN EL EXTERIOR | \$ 171.230.788 |
| USA PEEC | \$ 72.566.250 |
| Caring for Colombia | \$ 122.793.200 |

Asignación o Compromiso de Recursos por la Gerencia para la Reconstrucción

| | |
|--|--------------------------|
| Uniformes estudiantes de Mocoa | \$ 727,593,000 |
| Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II | \$ 8,500,000,000 |
| Adquisición del predio para la Fase I de construcción de vivienda Rural | \$ 1,907,820,000 |
| Escrituración del Predio Sauces | \$ 9,637,000 |
| Adquisición del predio para la Fase II de construcción de vivienda Rural | \$ 1,185,665,880 |
| Estudios y diseños técnicos para la construcción de la vivienda de interés prioritario (Interventoría) | \$ 1,455,032,040 |
| Asistencia Humanitaria de Emergencia | \$ 569,200,000 |
| Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva | \$ 1,700,000,000 |
| Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva | \$ 400,000,000 |
| Pavimentación de vías urbanas | \$ 5,000,000,000 |
| Mejoramiento de instalaciones Educativas e instalación de equipos | \$ 290,000,000 |
| Adecuación del Laboratorio de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Ciudad Mocoa | \$ 106,323,406 |
| Dotación de la Banda de Paz de la Institución Educativa Ciudad Mocoa | \$ 11,162,961 |
| TOTAL ASIGNADO | \$ 21.862.434.287 |
| POR ASIGNAR | \$ 15.135.815.528 |

- *Estos valores cambian de acuerdo al estudio de mercado y uso de suelo.*
- *Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar.*

| DONANTE | DESCRIPCIÓN |
|---------------------|---|
| Amerisur | Contenedor nevera para conservación de cadáveres |
| Telefónica-Movistar | 15 teléfonos Nokia 3500 Negros |
| Bettina Spitz | 7 cajas con prendas de vestir femeninas |
| DICORP | 5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de palma |
| Shelterbox | 63-Cajas Shelterbox |
| Global Medic | Mapas e Imágenes de drones de alta precisión |
| Asecones | 10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital |
| Gobierno de Japón | 30 Generadores eléctricos de 60 Hz |
| Eduardoño | 1 planta eléctrica |
| Gobierno de Turquía | Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares |
| Skinco Gyplac | 3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L |
| Terpel | 600 galones de ACPM para vehículos y plantas eléctricas |
| Fundación Éxito | Viveres para Asistencia Humanitaria |
| Colempaques | 421 Tanques de Almacenamiento de Agua 126 canecas plásticas para las viviendas |



Donación Colempaques

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE

\$668 Millones

2.542 Toneladas

AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

RECONSTRUCCIÓN MOCOCHA



MINDEFENSA



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



Presupuesto Estimado: **\$ 568.495.031.190**

CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL

\$ 48.378.596.017,06

1



DESARROLLO ECONÓMICO

\$ 13.930.000.000,00

2



DESARROLLO INSTITUCIONAL

\$ 20.911.372.000,00

3



DESARROLLO SOCIAL

\$ 10.457.249.685,60

4



INFRAESTRUCTURA SOCIAL

\$ 465.824.108.481,00

5



ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

\$ 8.993.705.006,00

6





1.509

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR

1.209 Viviendas Urbanas
300 Viviendas Rurales



VIVIENDA URBANA

- **Fase 1:** En Construcción 300 viviendas (Los Sauces I)

\$ 22.260 millones

- ✓ Área de cada vivienda: 64 m²
- ✓ 3 hectáreas predio Sauces I

AVANCE

- ✓ 97% de los estudios y diseños
- ✓ 12,1% de ejecución física
 - Se realizan trabajos de cimentación.
 - Conformación de terrazas
 - Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas



Tiempo de ejecución:

1 año - (mayo 2017-
mayo 2018)

VIVIENDA URBANA

• Fase 2:

**Construcción 909 viviendas
(Sauces II) \$60.448 millones**

AVANCE

- ✓ En proceso de Expropiación **Predio Sauces II.**
- ✓ **Área del predio:** 16.93 Hectáreas

Tiempo de ejecución:

1 año y seis meses –
(Diciembre 2017-
junio 2019)

CRONOGRAMA EXPROPIACIÓN

2017

OCTUBRE

- 14 Octubre:** Notificación Grupo 1
- 18 Octubre:** Notificación Grupo 2
- 23 Octubre:** Notificación Grupo 3
- 24 Octubre:** Inscripción oferta y resolución en Oficina de Instrumentos Públicos
- 30 Octubre:** Vencimiento término para presentar recurso de reposición Grupo 1

NOVIEMBRE

- 1 Noviembre:** Vencimiento término para presentar recurso de reposición Grupo 2
- 7 Noviembre:** Vencimiento término para presentar recurso de reposición Grupo 3
- 10 Noviembre:** Término para resolver recurso de reposición (TODOS)
- 14 Noviembre:** Expedición acto administrativo de expropiación
- 14 al 16 Noviembre:** Plazo notificación personal y envío por correo certificado
- 17 Noviembre:** Entrega bien, acta e inscripción en Oficina de Instrumentos Públicos
- 24 Noviembre:** Vencimiento plazo para expropiar
- 30 Noviembre:** Vencimiento término para presentar recurso de reposición

VIVIENDA RURAL

- **Construcción
300 viviendas**



\$16.390 millones

AVANCE

- ✓ Identificación de 261 familias por parte de la Alcaldía.
- ✓ Suscripción del convenio entre el Banco Agrario y la UNGRD
- ✓ Definición del Predio San Antonio de 7 hectáreas para construir entre 50 y 55 viviendas.
- ✓ Identificación de 3 predios aledaños para la construcción de 150 viviendas.
- ✓ Se envió carta solicitando avalúo del Predio San Antonio al IGAC
- ✓ CMGRD realizó visita técnica a los predios identificados

Tiempo de ejecución:


1 año - (Noviembre 2017 a Noviembre de 2018)

**1. Centro Regional de
Atención a Víctimas**
Unidad de Víctimas

2. Colegio Sauces II
MinEducación-UNGRD

**3. Centro de Atención
Inmediata-CAI,
Policía Nacional**
MinInterior

**4. Centro de Integración
Ciudadana**
MinInterior

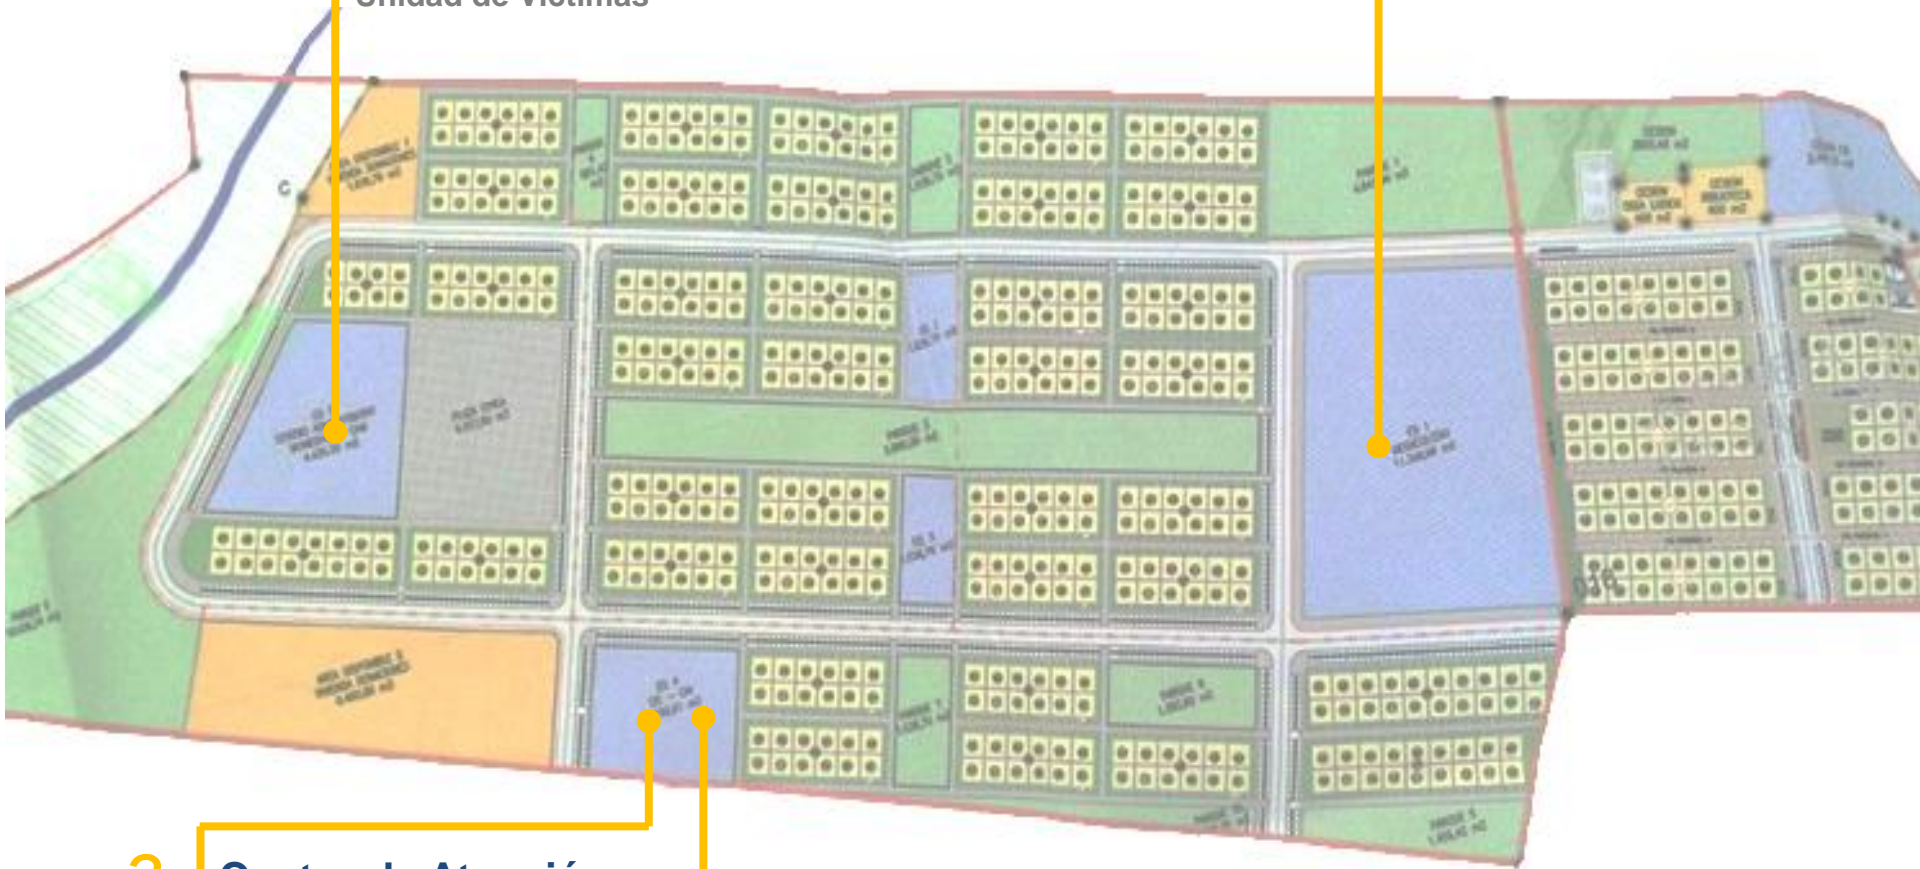

VIVIENDA URBANA

AVANCE

- ✓ Convenio con operador UNOPS
- ✓ Identificadas 220 viviendas por la Alcaldía
- ✓ **1ra Etapa-120 viviendas:**
 - Inicio de Obra: 15 de noviembre 2017
(25 viviendas en 20 días).
- ✓ **2da Etapa-100 viviendas:**
 - Inicio de Obra: 15 de diciembre 2017

Tiempo de ejecución: 2 años - (enero 2018 a marzo 2020)

VIVIENDA RURAL

AVANCE

- ✓ Se adjudicó la distribución del recurso para 2017.
- ✓ Se adelanta la focalización de potenciales beneficiarios.
- ✓ Se realizará la contratación con una Gerencia Integral para la ejecución de las obras.

Tiempo de ejecución: 2 años - (Octubre 2017 a Octubre 2019)

- **Mejoramiento de 300 viviendas –Prosperidad Social** \$4.972 millones

- **Mejoramiento de 350 viviendas –MinAgricultura** \$ 6.220 millones

• Instalación del SAT

\$1.223 millones

- ✓ 82% avance en la implementación del SAT
- ✓ 1 puesto de monitoreo instalado.
- ✓ 12 sirenas instaladas
- ✓ 11 sensores de río en instalación
- ✓ 4 estaciones meteorológicas en instalación

Fecha de terminación: 30 de Noviembre de 2017

• SAT Comunitario

\$205 millones

- ✓ 50% avance
- ✓ 10 personas haciendo monitoreo y en comunicaciones
- ✓ 48 planes comunitarios en construcción.
- ✓ 30 puntos de encuentro proyectados
- ✓ 15 planes escolares en gestión del riesgo en construcción.

Fecha de terminación: 30 de Enero de 2018

• Estudios y diseños SAT

\$600 millones

- ✓ 55% de avance
- ✓ Línea base información geológica, geomorfológica, hidrológica, hidráulica, geotécnica y SIG.
- ✓ Modelo lluvia-escorrentia.
- ✓ Primera versión de diagnóstico socio-territorial.

Fecha de terminación: Enero 2018





11.337 Personas
evacuaron



30 Puntos de
encuentro habilitados



25 Entidades públicas
participaron



14 Entidades privadas
participaron



• Pavimentación de 3 Kms de vías

\$5.000 millones

AVANCE

2 tramos de vía en ejecución

4.6% de avance en obra

57 mts de vía pavimentada

- Convenio con ingenieros militares – UNGRD en ejecución
- Se iniciaron obras el 15 de septiembre
- ✓ Intervención de 110 ml de la **Vía Victoria Regia**
 - Se inicia vaciado en concreto
- ✓ Inicio de intervención de 126 ml de la **Vía Pablo VI**

Tiempo de ejecución:

18 meses
(Octubre 2017 a Marzo 2019)



• Construcción de 4 puentes peatonales

\$ 348 millones

- ✓ **Puente Mulato** Terminado 100%
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel** Terminado 100%
- ✓ **Puente Dantayaco**
Vereda San José del Pepino Terminado 100%
- **Puente Campucana**
Se realizó la visita técnica para la definición del punto.

Tiempo de ejecución:

6 meses
(Agosto 2017 a Diciembre 2017)



Puente Dantayaco



Puente Mulato



Puente Villa Rosa – San Miguel

• Construcción plaza de mercado definitiva- Prosperidad Social-UNGRD \$8.100 millones

AVANCE

- ✓ En proceso de expropiación predio Santa Mónica por la UNGRD (2 Has) (57 propietarios del predio)
- ✓ **FASE 1 (UNGRD) - \$ 2.000 millones**
 - **Componente 1:** (\$400 millones)
 - Adquisición de Predio
 - **Componente 2:** (\$1.700 millones)
 - Estudios y diseños
 - Interventoría
 - Obras de estabilización de terreno
 - Obras de adecuación de acceso
 - Obras de conexiones a servicios públicos
- ✓ **FASE 2 (Prosperidad Social) - \$ 6.000 millones**
 - Construcción (\$6.000 millones)

Tiempo de ejecución:

2 años y 5 meses -
(noviembre 2017 a marzo de 2020)

CRONOGRAMA EXPROPIACIÓN

2017

AGOSTO

31 Agosto: Notificación Oferta de Compra e inscripción Oficina de Instrumentos Públicos

7 Septiembre: Presentación Recurso de Reposición

13 Septiembre: Radicación en IGAC solicitud de revisión avalúo presentado por propietarios

14 Septiembre: Envío a propietarios comunicación de información de solicitud al IGAC y suspensión proceso de negociación

16 Septiembre: Devolución correo certificado por destinatario desconocido

28 Septiembre: Notificación personal solicitud al IGAC y suspensión proceso de negociación

SEPTIEMBRE

9 Octubre: Respuesta del IGAC ratificando avalúo

10 Noviembre: Resuelve recurso de reposición

14 Noviembre: Expedición Acto Administrativo de expropiación

15-17 Noviembre: Plazo notificación personas expropiación

20 Noviembre: Entrega del bien, acta e inscripción en Oficina de Instrumentos Públicos

22 Noviembre: Plazo para presentar recurso de reposición contra expropiación

NOVIEMBRE



7.175

Total de Contratos de Arriendo suscritos

\$10.200 millones



4.570

Subsidios de arriendo iniciales entregados



1.485

Subsidios de arriendo prorrogados por primera vez



1.120

Subsidios de arriendo prorrogados por segunda vez



100%

Pagos efectuados de la primera prórroga



«Los subsidios se cancelan a los beneficiarios hasta la entrega de la solución de vivienda»



1,315

Primera Entrega
(Octubre)



1,298

Segunda Entrega
(Noviembre)



2,613

TOTAL AHE ENTREGADAS
A LA FECHA

\$360 millones

Actividades a realizarse:

- ✓ Filtros
- ✓ Adecuación y nivelación de terrenos
- ✓ Construcción de parque infantil
- ✓ Rehabilitación del salón social

AVANCE

- ✓ **67%** avance de actividades
- ✓ Se realiza la construcción de filtros y nivelación de terreno.

Tiempo de
ejecución:

3.5 meses
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017)



Excavación Filtros Sistema de Drenaje



Nivelación de terrenos y filtros

\$ 264 millones

- ✓ **40 medios de vida entregados** para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.
- ✓ Se realizó transferencia a la Alcaldía, para la entrega de 20 medios de vida más.



AVANCE

- **Contratación de 12 profesionales para la creación de:**
 - ✓ Asesoría para la creación de la Secretaria de Gestión del Riesgo Municipal.
 - ✓ Asesoría para la creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
 - ✓ Asesoría para la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta.
- **Adecuación de la Oficina de Gobierno Nacional-OGN**



ACTIVACIÓN SECTOR AGROPECUARIO

AVANCE

- ✓ Asignación de recursos por parte del Ministerio de Agricultura para desarrollar proyectos en:
 - Avicultura
 - Cítricos
 - Plátano
 - Aguacate
 - Asistencia Técnica
 - Suministro de Equipos y Herramientas
- ✓ Se adelanta un plan de asistencia técnica municipal.
- ✓ *Convenio firmado entre MinAgricultura y UNGRD.*
- ✓ Definición de las **180 familias** a ser beneficiadas entre la Alcaldía y el Ministerio de Agricultura.
- ✓ 2 profesionales apoyan labores en la Oficina de Gobierno Nacional

- **Reactivación Económica para 180 familias- Alcaldía y MinAgricultura**
\$1.020 millones

Tiempo de ejecución:

6 meses
(noviembre 2017 a mayo de 2018)

PUENTES VEHÍCULARES

- **4 puentes vehiculares**
\$9.700 millones

1. Puente sobre el río Sangoyaco - Terminal

- ✓ En etapa de preconstrucción (Estudios y Diseños)
- ✓ **Responsable: INVIAS**

2. Puente sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia


- ✓ Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de recursos adicionales del INVIAS
- ✓ **Responsable: INVIAS**

3. Puente sobre el río Sangoyaco - Terminal

- ✓ Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de recursos adicionales del INVIAS
- ✓ **Responsable: INVIAS**

4. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Contrato en ejecución Concesión Santana-Mocoa- Neiva
- ✓ Fase de Estudios y Diseños completada
- ✓ Proyección de inicio de obras febrero 2018
- ✓ **Responsable: ANI**

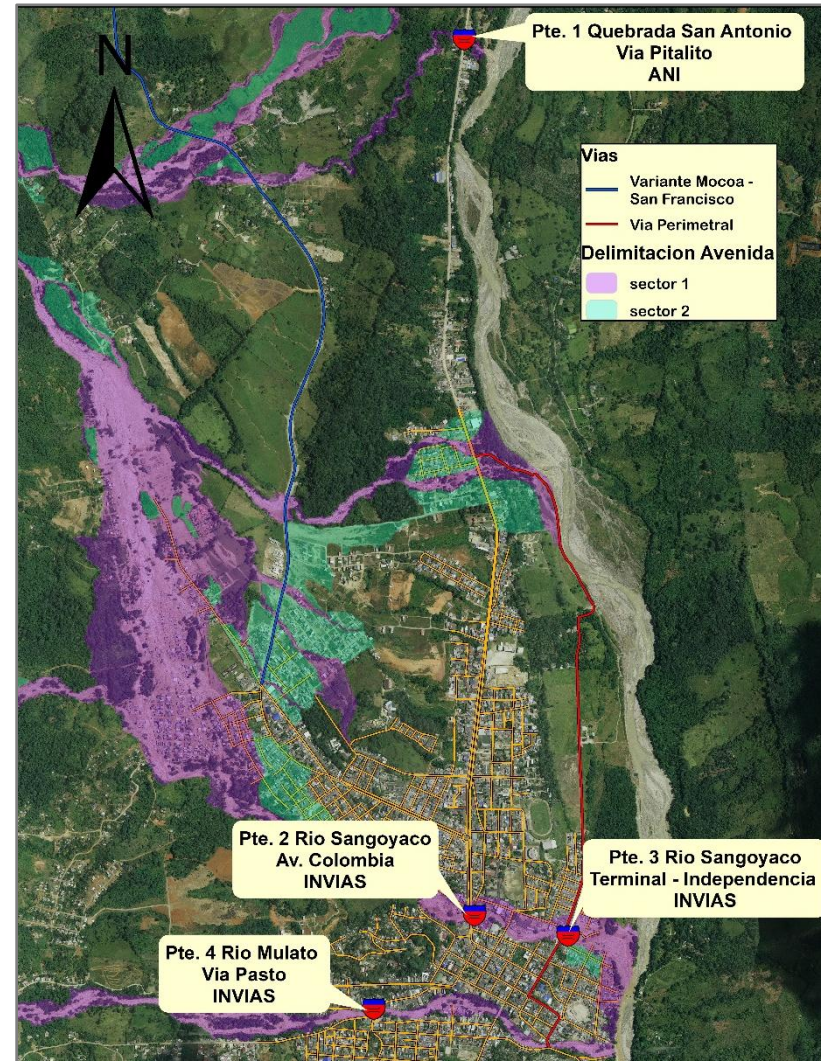

MAQUINARIA Y EQUIPO

AVANCE


- ✓ Priorización de maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía:
 - 1 Bulldozer
 - 2 Carrotanques
 - 1 Retroexcavadora
 - 1 Motoniveladora
 - 1 Vibrocompactador
 - 1 Vactor

Tiempo de
ejecución:

5 meses-
(Septiembre 2017 a Enero 2017)

- **Combo de Maquinaria Amarilla-INVIAS**

\$ 5.000 millones

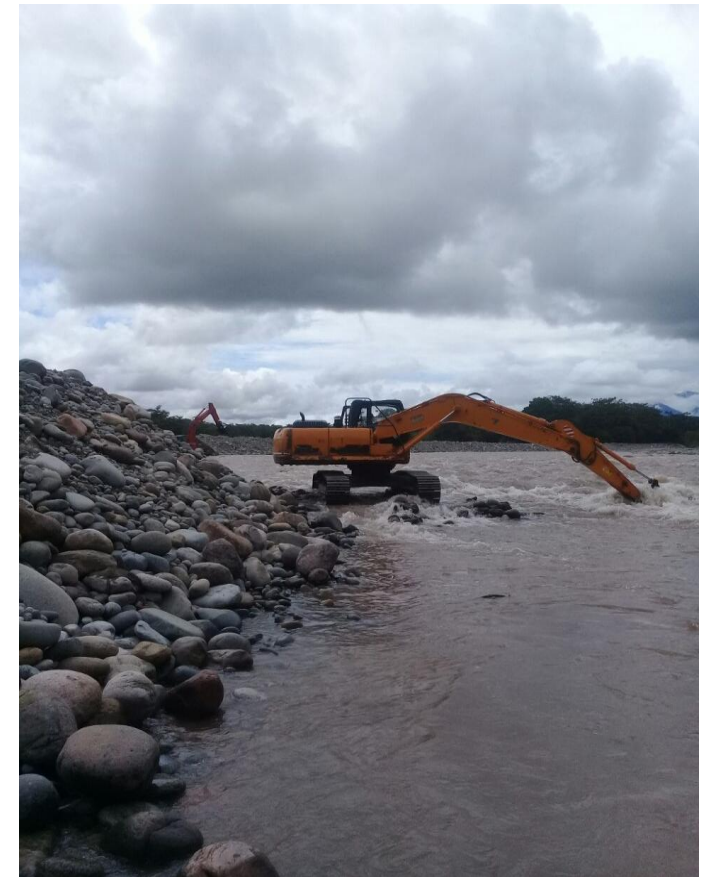

ACUEDUCTO

- **Construcción del Acueducto- Viceministerio de Agua**

\$28.074 millones

AVANCE

- ✓ Inicio de la consulta previa el día 14 de octubre con la comunidad Indígena para llegar a un acuerdo para el desarrollo de las obras en este resguardo.
- ✓ Se transfirieron recursos a la Alcaldía de Mocoa para el soporte a la consulta previa.
- ✓ Se adelantó actividades de localización y replanteo de la nueva planta de tratamiento y del tanque de almacenamiento No. 1.
- ✓ Se avanza en los estudios, diseños e ingeniería de Bocatoma y obras de mitigación para la línea de conducción de la zona norte.

ALCANTARILLADO

- **Plan Maestro de Alcantarillado**

\$91.200 millones

AVANCE

- ✓ Presentación del CONPES el 24 de octubre de 2017.
- ✓ Fue aprobado el crédito.

UNIFORMES

AVANCE

- ✓ La UNGRD adelantó la contratación de los uniformes.
- ✓ Se realizó la entrega de la totalidad de los uniformes. **Cumplido 100%.**

- Adquisición de uniformes para 2.518 estudiantes.

\$727 millones



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- **Construcción y mejoramiento de sedes educativas**

\$29.000 millones

AVANCE

- **Construcción del colegio ubicado en el predio los Sauces II - UNGRD, con apoyo MinEducación.**

✓ Se tiene estructurado el convenio entre el MinEducación y la UNGRD.
Tiempo de Ejecución: 2 años (noviembre 2017 a marzo de 2019).

COMPROMISO...

- Adquisición del Predio Sauces II para la construcción.

- **Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación**

✓ Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Mayo de 2018.
Finaliza: Mayo 2019

- **Mejoramiento de 9 sedes educativas– MinEducación**

✓ Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Febrero de 2018
Finaliza: Mayo 2019

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- **Adecuación Colegio Ciudad Mocoa**
\$290 millones

AVANCE

Actividades a realizarse:

- ✓ Cubierta
- ✓ Adecuación de placa deportiva
- ✓ Convenio marco firmado entre UNGRD-Colegio
- ✓ Contrato de ejecución en proceso
- ✓ Donación de Caracol TV (Yo me llamo)
- ✓ Adecuación del Laboratorio de Ciencias Naturales (Caring for Colombia)
- ✓ Dotación de la Banda de Paz (Caring of Colombia)



OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

\$5.500 millones

- **Construcción Biblioteca-MinCultura**

- ✓ Ministerio de Cultura realizará la dotación
- ✓ Embajada de Japón realizará la construcción
- ✓ El lote identificado se encuentra en estudio de suelos
- ✓ **Inicio de obras:** 5 de Diciembre 2017

- **Construcción Casa Lúdica-Cancillería**

- ✓ Se adelanta la fase de estudios y diseños.
- ✓ **Inicio de Obra:** Diciembre 2017

Finaliza: Marzo 2018

- **Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los sauces I - MinVivienda**

- ✓ MinVivienda adelantó en convenio con FINDETER, la contratación de la obra el 2 de octubre de 2017 y adjudicación de la interventoría el 13 de octubre de 2017
- ✓ En etapa de estudios y diseños
- ✓ **Con la Donación de Give To Colombia se realizará la dotación del CDI**

Finaliza: Julio 2018

- **Construcción de Subestación eléctrica Definitiva**



RENACER

\$45.000 millones

3 años - MINMINAS

5% de Avance en la recuperación de la subestación afectada (Junín), la cual se utilizará temporalmente.

- **Subsidios al Consumo de energía eléctrica**

\$1.522 millones

Subsidios 100% consumo a estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Mocoa registrados en el R.U.D por 6 meses

\$ 2.984 millones

• **Licencias de Emisoras Comunitarias**

- ✓ Se otorgaron 3 licencias: Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asociación de Diversidades Funcionales y Fundación Social de Mujeres

Tiempo de ejecución: 9 Agosto 2017

• **Despliegue de Televisión Digital Terrestre**

- ✓ Se realizará la entrega de 4.500 decodificadores de TDT.

Tiempo de ejecución: Enero 2018

• **200 Becas Talento Tecnología de la Información**

- ✓ Convenio con OIT para formación para el trabajo.
- ✓ 400 aspirantes se presentaron a becas para estudiar técnicos laborales en Tecnologías de la Información, el 13 de octubre; de los cuales 144 son damnificados

Tiempo de ejecución: Enero 2018

• **Instalación de Punto Vive Digital**

- ✓ Instalación del Punto Vive Digital en el Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP

Tiempo de ejecución:

Diciembre 2017



- **Construcción y dotación Hospital José María Hernández**
\$ 33.826 millones

✓ Se adelanta la construcción del Hospital con un avance físico del **35%**

Tiempo de ejecución: Marzo 2020



• Revisión y ajuste del PBOT + Estudios de Riesgos



PROGRAMA
**POT
MODERNOS**

Valor:

\$ 4.886* millones

* Incluye estudios de riesgos

Tiempo de
ejecución:

9 meses

(Ago. 2017 – Jun. 2018)

Actividades adicionales del DNP

- ✓ Apoyo permanente a la Gerencia
- ✓ Apoyo para la actualización del Plan de Desarrollo Municipal
- ✓ Contratación de un enlace entre el DNP y el municipio (en proceso)

Avances

- ✓ Firma de convenio entre Alcaldía y POT Modernos (3 de agosto)
- ✓ Definición de 20 centros poblados para realizar estudios – Comité TARM (3 de agosto)
- ✓ **Fase de pre-alistamiento:**
 - Conformación del Comité Técnico Ambiental y de Riesgos
 - Apoyo a entidades nacionales para identificar y viabilizar suelo disponible en el corto plazo
- ✓ **Fase de alistamiento:**
 - Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento
 - Elaboración de estudios especializados
- ✓ **En proceso:** contratación de nuevo operador (Consorcio INYPSA)

• Documento CONPES

- ✓ El Consejo de Ministros aprobó el 31 de octubre el CONPES: Plan para la reconstrucción de Mocoa para el período 2017-2022
- ✓ **Valor Conpes:** \$ 1.181 billones
- ✓ 6 líneas estratégicas
- ✓ 122 proyectos

Competitividad en el Sector Turismo

✓ Reactivación de 170 negocios formales

\$ 4.675 millones

-En procesos de puesta en marcha de las unidades de negocio y entrega de activos e inventario para la operación de 120 negocios.

- En evaluación 50 negocios
- 80 unidades operando

✓ Comunidades indígenas

\$ 200 millones

- En ejecución: Fortalecimiento productivo y comercial de **5 cabildos**.

• Cofinanciación Bancoldex-FNG

✓ Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por **15.653 Millones** a intermediarios financieros, representados en 320 operaciones y más de **2.842 beneficiarios**.

✓ Garantías – FNG: **\$10.055 millones** en **492 créditos garantizados**.



- ✓ **Mesa técnica ambiental sigue funcionando**
- ✓ **IGAC adelanta fotocontrol para elaborar y suministrar ortofoto necesaria para la modelación por SGC.**
- ✓ **Asesoría y acompañamiento en la definición de obras de mitigación**
- ✓ **Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA y Ministerio de Ambiente adelantan modelación.**
- ✓ **Mediante Resolución No. 1336 de octubre 9 de 2017, Corpoamazonia estableció los determinantes ambientales para la formulación, revisión o modificación del PBOT de Mocoa.**
- ✓ **MADS y Corpoamazonia trabajan para presentar obras de mitigación y reducción del riesgo.**



Servicio Geológico Colombiano realiza el diseño de obras de mitigación

Febrero 2018: Entrega de diseños de obras pequeñas que ayudar a reducir cauce

Abril 2018: Entrega de diseños definitivos de obras definitivas
