

# AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

# RECONSTRUCCIÓN MOCOYA

30 DE ENERO DE 2018



MINDEFENSA



## EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

## MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



## PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

## INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averiados	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3

## ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

## PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas  
**120 Reuniones Realizadas**

Miembros del SNGRD que operaron  
**Más de 2.300**

Personas Atendidas en los Puesto de Información  
**Más de 10.000**

## ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina) Incluidas las Donaciones de la Primera Dama, Empresas Privadas y Comunidad  
**2.540 Toneladas Entregadas**

## APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados  
**297 Fallecidos**

**FASE DE RESPUESTA**  
**100%**  
**EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN**



## SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela)  
**57.945**

Vacunas Aplicadas Animales  
**1.639**

## ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional  
**100%**

## TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos  
**100%**



## AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados	<b>Más de 88 millones</b>
Litros de Agua Entregados por Día	<b>1 millón</b>

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

**Hoy 3 Carrotanques se encuentran disponibles**

## ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los Albergues	<b>4.561</b>
Albergues que fueron Habilitados y Administrados	<b>9</b>

## SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados	<b>4.448</b>
----------------------------------	--------------

**Valor Subsidios: \$10.200 millones**  
**Hasta junio de 2018**

## FASE DE ESTABILIZACIÓN

**100%**  
**90 días**



*Familias Albergue el Pepino*

## Transporte y traslados

Personas que fueron trasladadas a otras ciudades con el apoyo de Cancillería y OIM	<b>765</b>
--	------------

## MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

**Se utilizaron 51.642 Horas Máquina** para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

## INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

## AGUA

Bocatomas en Rehabilitación **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable terminada (Suroccidente) **1**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro, Barrios Unidos y Norte) **3**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico- MinVivienda, Logística- Ejército Nacional

## COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA

## EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**



## CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños | **2.056**

Jornadas Socioculturales | **61**

## AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación  
de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente) | **1**

## EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de  
Escombros, Manejo de Maquinaria, ) | **270**

## NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y  
Madres Gestantes | **47  
Toneladas  
entregadas**

## CONTINUAMOS EN ...

- Subsidio de Arriendo para propietarios de vivienda destruida.
- Suministro de Agua en Carrotanques.
- Fortalecimiento Institucional del Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

**INSTALACIÓN DE LA  
OFICINA DEL  
GOBIERNO NACIONAL  
PERMANENTE EN  
MOCOA - OGN**

## Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD

Cuenta Davivienda No. **021666888**

Donaciones Nacionales	\$ 10.089.155.785
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	\$ 27.239.109.617
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37.328.265.402</b>

CHINA	\$ 2.854.900.000
EMIRATOS ARABES	\$ 19.690.929.675
TURQUÍA	\$ 430.250.000
BANCO CENTROAMERICANO	\$ 718.375.000
BID	\$ 569.200.000
CAF	\$ 285.765.000
KEYCOFFEE	\$ 26.378.087
MITSUBISHI	\$ 131.890.436
KEIMYUNG CARITAS (SOUTH KOREA)	\$ 12.840.994
DINAMARCA	\$ 130.434.782
USA PEEC	\$ 72.566.250
CARING FOR COLOMBIA	\$ 122.793.200
USTOA	\$ 14.820.000

BOOYOUNG HOUSING CO LTD (SOUTH KOREA)	\$ 294.796.029
LIG NEX1 CO.,LTD.	\$ 59.340.000
TAILANDIA	\$ 292.820.000
GIFU BROADCASTING	\$ 2.641.578
COREA	\$ 871.950.000
WORLD TRADE ORGANIZATION	\$ 9.460.391
HYUNDAI	\$ 293.170.000
COLOMBIANOS EN ALEMANIA	\$ 8.071.446
PERSONAS EN EL EXTERIOR	\$ 172.350.083
GIVE TO COLOMBIA	\$ 173.366.667

## Asignación Recursos Donaciones

Uniformes estudiantes de Mocoa	\$ 727,593,000
Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II	\$ 8,500,000,000
Adquisición del predio Sauces I - Vivienda Urbana	\$ 1,907,820,000
Escrituración del Predio Sauces I – Vivienda Urbana	\$ 9,637,000
Estudios, diseños e interventoría Predio Sauces I - Vivienda Urbana	\$ 1,455,032,040
Adquisición del predio Sauces II - Vivienda Urbana	\$ 1,185,665,880
Asistencia Humanitaria de Emergencia	\$ 569,200,000
Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva	\$ 1,700,000,000
Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva	\$ 400,000,000
Pavimentación de vías urbanas	\$ 5,000,000,000
Mejoramiento de instalaciones educativas e instalación de equipos Colegio Ciudad Mocoa	\$ 290,000,000
Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa	\$ 122,793,200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil	\$ 173,366,667
Estudios y diseños para las obras de mitigación	\$ 3,000,000,000
1 puente peatonal	\$ 10,335,622
Obras civiles de emergencia	\$ 6,146,452,646
<b>TOTAL ASIGNADO</b>	<b>\$ 31,197,896,055</b>
<b>POR ASIGNAR</b>	<b>\$ 6,130,369,347</b>

- *Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar.*



SECTOR  
**VIVIENDA**

---



**1.461**

**Total Viviendas a Construir**

**1.209** Viviendas Urbanas



**252** Viviendas Rurales



## Vivienda Urbana

**Fase 1: Construcción de 300 viviendas  
(Los Sauces I)**

**\$ 22.260 millones**

### Avance:

- ✓ **99,2%** de avance en la etapa de estudios y diseños.
- ✓ **20,6%** de avance físico de la obra.
- ✓ El contratista de obra realizó la formulación de un Plan de Contingencia para garantizar el cumplimiento del cronograma para la ejecución del proyecto y la entrega de viviendas.

### Compromisos:

- Realizar la postulación de las familias beneficiadas.
- Realizar estudio técnico y determinar la viabilidad de los recursos para la instalación de servicios públicos en el predio.- Viceministerio de Agua



*Avance de construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I*

**Tiempo de ejecución:** **1 año**  
(Mayo 2017- Mayo 2018)

## Vivienda Urbana

### Fase 2: Construcción de 909 viviendas (Los Sauces II)

\$60.448 millones

#### Avance:

- ✓ Se realizó la inscripción del acta de posesión del predio en Instrumentos Públicos.
- ✓ Fue perfeccionado el Otrosí N°1 del convenio suscrito entre el FNGRD y Fonvivienda.

#### Compromisos:

- Continuar con el proceso de contratación de estudios, diseños, obra e interventoría.



**Tiempo de ejecución:**

1 año y 6 meses  
(Diciembre 2017-  
Junio 2019)

## Acueducto

### Construcción del Sistema de Acueducto- Viceministerio de Agua

\$28.074 millones

#### Avance:

- ✓ **5.7%** de avance físico en estudios, diseños y obra.
- ✓ **45%** de avance físico en la instalación de redes de acueducto.
- ✓ **5.497** metros lineales instalados de redes de acueducto.
- ✓ En proceso de Consulta Previa por parte del Resguardo Indígena INGA.

#### Compromisos:

- Proceso de acopio de materiales e inicio de obras de la bocatoma. (1° semana de Febrero)



Avance instalación de redes de acueducto

**Tiempo de ejecución:** 8 meses

## Alcantarillado

\$91.200 millones

#### Avance:

- ✓ Diseños entregados para la vigencia 2018, y ejecución para el 2019 y 2020.
- ✓ En revisión minuta del préstamo con el BID

## Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los Sauces I – MinVivienda

\$ 3.500 millones

### Avance:

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ Se definió que los recursos donados por la organización “Give To Colombia” por valor de **\$173 millones** serán destinados para la **dotación del CDI**.



### Compromisos:

- Entregar el cronograma de obra -  
MinVivienda

**Fecha de  
Finalización:**

Julio de 2018



SECTOR  
**AGRICULTURA**

---

## Vivienda Rural

**Construcción de 252 viviendas**

**\$16.390 millones**

### Avance:

- ✓ El Ministerio de Agricultura definió realizar el aporte del 100% de los recursos.
- ✓ La Alcaldía definió 3 predios en la Vereda Las Planadas con 26 hectáreas en total, para la ejecución del proyecto.
- ✓ El IGAC entregó el avalúo comercial de los 3 predios de la Vereda Las Planadas- Cabaña 1, Cabaña 2 y Planadas.

### Compromisos:

- Realizar el desembolso de los recursos a la UNGRD - Banco Agrario.
- Adquisición de los predios definidos – UNGRD.



**Tiempo de ejecución:** 1 año y 5 meses

## Vivienda Rural

**Mejoramiento de 350 viviendas -  
MinAgricultura**

**\$ 6.220 millones**

### Avance:

- ✓ La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas.

### Compromisos:

- Presentar el proyecto en la próxima comisión de vivienda para definir la disponibilidad de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural”.



## Activación Sector Agropecuario

### Reactivación Económica para 180 familias- Alcaldía y MinAgricultura

\$1.020 millones

#### Avance:

- ✓ Definición de 180 familias a ser beneficiadas con el proyecto.
- ✓ Definición de proyectos en avicultura, cítricos, plátano, aguacate, asistencia técnica y suministro de herramientas y equipos.
- ✓ Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía.
- ✓ Se encuentra en ejecución el Plan de Asistencia Técnica.

#### Compromisos:

- Realizar el desembolso de los recursos al FNGRD - Banco Agrario.

**Tiempo de ejecución:** 6 meses

SECTOR  
**PROSPERIDAD SOCIAL**

---

## Vivienda Urbana

Mejoramiento de 300 viviendas-

Prosperidad Social

\$4.972 millones

### Avance:

- ✓ Convenio suscrito con el operador UNOPS.
- ✓ La Alcaldía identificó a 220 familias a ser beneficiadas.
- ✓ Se definieron 3 etapas del proyecto:
  - **1era Etapa:** 120 viviendas. **Duración:** 3,5 meses.
  - **2da Etapa:** 100 viviendas. **Duración:** 3 meses.
  - **3ra Etapa:** 80 viviendas. **Duración:** 2,5 meses.

### Compromisos:

- Realizar el desembolso de los recursos a la UNGRD.
- **1era Etapa:** Realizar la socialización del proyecto a la comunidad y determinar la ubicación de las familias. **Plazo:** Enero de 2018.
- **2da Etapa:** Realizar la socialización del proyecto a la comunidad. **Plazo:** Febrero de 2018.
- Entregar las certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas de la segunda etapa – Alcaldía.

## Construcción Plaza de Mercado Definitiva

**\$8.100 millones**



### Avance:

- ✓ **Fase 1 Preconstrucción: UNGRD- Inversión: \$2.100 millones**
  - Componente 1 Expropiación del Predio – Inversión: \$400 millones.
    - Se realizó la inscripción del acta de posesión del predio en la Oficina de Instrumentos Públicos.
    - Se inicio el proceso de contratación de cerramiento.
  - Componente 2 Estudios y Diseños – Inversión: \$1.700 millones.
    - Se determinó que se deben adquirir 2 hectáreas y se deben realizar obras de acceso y de conexiones a servicios públicos.
- ✓ **Fase 2 Construcción: Prosperidad Social- Inversión \$6.000 millones**
  - Se suscribió convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD.
  - Se da inicio al proceso de contratación del predio.

### Compromisos:

- Revisar la infraestructura para instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales- DPS/ UNGRD.
- Determinar la fuente de financiación de la etapa de estudios y diseños, en revisión estructuración convenio con la Universidad Nacional. –UNGRD
- Entregar el listado de comerciantes a ser beneficiados – Alcaldía.

**Tiempo de ejecución:**

**2 años y 5 meses  
(Diciembre 2017  
a Marzo de 2020)**

SECTOR  
**EDUCACIÓN**

---

## Infraestructura Educativa

### Construcción y mejoramiento de sedes educativas

\$29.000 millones

#### Avance:

- ✓ Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Saucos II – UNGRD con apoyo de Min Educación.
  - Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación.
  - Más de 960 niños a beneficiar.
  - Fecha de inicio de obras: Agosto 2018.
  - Fecha de finalización: Mayo de 2019
- ✓ Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación.
  - Se suscribió convenio con Findeter.
  - Fecha de inicio de obras: Marzo de 2018.
  - Fecha de finalización: Marzo de 2019.
- ✓ Mejoramiento de 9 sedes educativas – MinEducación
  - Se suscribió convenio con Findeter .
  - Fecha de inicio de obras: Junio de 2018.
  - Fecha de finalización: Septiembre de 2018.

#### Compromisos:

- Dar inicio al proceso de contratación de la consultoría de diseños, obra e interventoría, una vez se cuente con la Licencia de Urbanismo – UNGRD (Abril de 2018).

## Infraestructura Educativa

### Adecuación Colegio Ciudad Mocoa

\$290 millones – Donación de Caracol TV (Yo me Llamo)

#### Avance:

- ✓ Mediante convenio suscrito entre la UNGRD y el Colegio Ciudad Mocoa, se realizan las obras de adecuación de la cubierta y de la placa de la cancha y la adecuación de acceso peatonal de la sede educativa.
- ✓ **40%** de avance físico en la adecuación del colegio.
- ✓ Se definió que los recursos donados por la Fundación “Caring For Colombia” por valor de **\$123 millones** serán destinados para la **adecuación del laboratorio de ciencias naturales y de la banda de paz.**

#### Compromisos:

- Dar inicio al proceso de contratación para adquisición del material académico – UNGRD (Febrero de 2018)



*Avance adecuación del Colegio Ciudad Mocoa*

SECTOR  
**CULTURA**

---



# OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

## Construcción Biblioteca- MinCultura- Embajada de Japón

\$ 600 millones

### Avance:

- ✓ La Embajada de Japón está encargada de la ejecución de la obra.
- ✓ MinEducación está encargado de la dotación de la Biblioteca.
- ✓ **100%** de avance físico en la adecuación y cerramiento de terrenos.
- ✓ **70%** de avance físico en la construcción.

### Compromisos:

- Dar inicio a las obras de enchape de pisos, instalación de baterías de baño y colocación de cubierta



Avance construcción biblioteca

**Fecha de  
Finalización:**

Marzo de 2018

SECTOR  
**CANCILLERÍA**

---

## Construcción Casa Lúdica Los Sauces I

\$ 600 millones

### Avance:

- ✓ Los diseños se encuentran en proceso de elaboración.

**Fecha de Inicio de las obras:**

Enero de 2018

### Compromisos:

- Una vez los diseños estén culminados se debe realizar el trámite para obtener la licencia de construcción.- Cancillería.

**Fecha de Finalización:**

Junio de 2018

---

## Construcción de Espacio Deportivo

\$ 99 millones

### Avance:

- ✓ Los diseños fueron culminados.
- ✓ En tramite perfeccionamiento del convenio suscrito entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería.

**Fecha de Inicio de las obras:**

Enero de 2018

### Compromisos:

- Realizar el trámite para obtener la licencia de construcción.- Cancillería.

**Fecha de Finalización:**

Marzo de 2018

SECTOR

# GESTIÓN DEL RIESGO

---

## Construcción de 4 puentes peatonales

\$ 348 millones

### Avance:

- ✓ **Puente Mulato:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Dantayaco:** 100% terminado.
- ✓ **Puente San Agustín:** En proceso de contratación.

**Fecha de entrega del Punto:** Febrero 2018.



*Puente Dantayaco*



*Puente Mulato*



*Puente Villa Rosa – San Miguel*

## Pavimentación de 2.8 Kms de vías

\$5.000 millones

### Avance:

- ✓ 4 tramos de vía terminados
- ✓ 1 tramo en ejecución de etapa preliminar con obras de acueducto.
- ✓ 286 metros lineales de vías pavimentadas.
- ✓ 10,7% de avance físico de las obras.

### VÍAS:

- **Victoria Regia:** Intervención de 110 ml  
Avance físico pavimentación: **100%**
- **Pablo VI:** Intervención de 126 ml  
Avance físico pavimentación: **100%**
- **La Brigada:** Intervención de 190 ml  
Avance físico obras preliminares: 22%

### Compromisos:

- Entregar diseños de 17 vías pendientes de intervención-  
Alcaldía.

**Tiempo de ejecución:**

18 meses  
(Octubre 2017 - Marzo 2019)



Tramo Victoria Regia



Tramo La Brigada

## Instalación del SAT

\$1.223 millones

### Avance:

- ✓ **100%** de avance en la implementación del SAT.
- ✓ 1 puesto de monitoreo instalado
- ✓ 11 sensores de río colocados
- ✓ 4 estaciones meteorológicas instaladas

## Estudios y diseños SAT

\$600 millones

### Avance:

- ✓ **80%** de avance en el estudio realizado con el apoyo de la Universidad Javeriana.

## SAT Comunitario

\$205 millones

### Avance:

- ✓ **97%** en la implementación del SAT comunitario.
- ✓ 27.800 habitantes a ser beneficiados
- ✓ Se comienza la socialización de los Planes Comunitarios a la comunidad.



## Mejoramiento Cancha el Pepino y Salón Comunal

\$360 millones

### Avance:

- ✓ **98%** de avance físico del proceso de rehabilitación.
- ✓ 3.700 personas a ser beneficiadas

### Compromisos:

- Entregar la cancha en el mes de enero de 2018.



**Tiempo de ejecución:**

**3 meses**

(Septiembre 2017 a Diciembre 2017)



## MEDIOS DE VIDA

**Responsable:**  
**UNGRD**

**INVERSIÓN:**  
**\$ 351 millones**

- ✓ **60 medios de vida entregados** para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.

## SUBSIDIOS DE ARRIENDO

**Responsable:**  
**UNGRD**

**INVERSIÓN:**  
**\$ 10.200 millones**

<b>8.308</b>	<b>Subsidios otorgados a la fecha</b>
<b>1.485</b>	<b>Primera Prorroga</b>
<b>1.186</b>	<b>Segunda Prorroga</b>
<b>1.133</b>	<b>Tercera Prorroga</b>

## ASISTENCIA HUMANITARIA

<b>1.218</b>	<b>Primera Entrega (Octubre)</b>
<b>1.060</b>	<b>Segunda Entrega (Noviembre)</b>
<b>972</b>	<b>Tercera Entrega (Diciembre)</b>
<b>1.045</b>	<b>Cuarta Entrega (enero)</b>

**4.295 kits de asistencia humanitaria** entregados a las familias afectadas y registradas en el RUD, que reciben subsidio de arriendo



SECTOR  
**INFRAESTRUCTURA VÍAL**

---

## 4 Puentes Vehiculares

\$9.700 millones

### 1. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **Fecha de inicio de obras:** Febrero 2018
- ✓ **Responsable:** ANI

### 2. Puente sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia


- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** **Sin Recursos**

### 3. Puente sobre el río Sangoyaco – Terminal

- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** **Sin Recursos**

### 4. Puente sobre el río Mulato – Terminal

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **1% de avance físico de la obra**
- ✓ **Responsable:** INVIAS

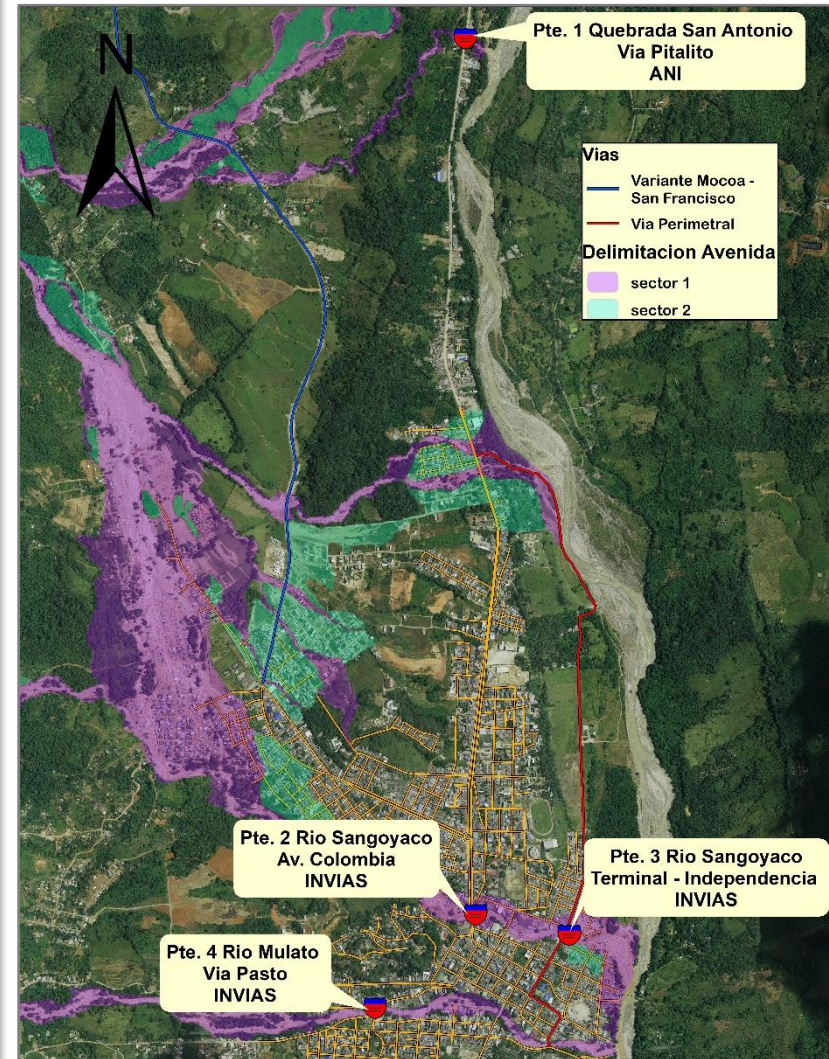

## Maquinaria y Equipo

### Combo de Maquinaria Amarilla

\$ 5.000 millones

#### Avance:

- ✓ La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla a adquirir, de la siguiente manera:
  - 1 Bulldozer
  - 2 Carrotanques
  - 1 Retroexcavadora
  - 1 Motoniveladora
  - 1 Vibrocompactador
  - 1 Vactor
- ✓ Se realizó la proyección de equipos a adquirir con recursos del FNGRD- UNGRD.

#### Compromisos:

- Asignación de recursos al INVIAS por valor de \$4.000 millones - MinHacienda.



SECTOR  
**ENERGIA**

---

## Reubicación Subestación Eléctrica \$45.000 millones

### Avance:

- ✓ **Etapas 1- Funcionamiento de operación móvil:**
  - En funcionamiento
- ✓ **Etapas 2- Readecuación subestación Junín:**
  - **30%** de avance físico, representado en limpieza de equipos, reconstrucción de la sala de control y remplazo e instalación de tableros.
- ✓ **Etapas 3 -Construcción de una nueva subestación “RENACER”:**
  - **4%** de avance físico
  - En proceso de elaboración de estudios ambientales.



### Compromisos:

- Realizar el cronograma de ejecución del proyecto- MinMinas.

## Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica \$462 millones

### Avance:

- ✓ Se otorgará por un periodo de **6 meses** subsidios a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 registrados en el RUD y que figuren como usuarios de la Empresa de Energía de Putumayo (Según Resolución N° 41530 de Dic.de 2017)

SECTOR  
**TELECOMUNICACIONES**

---

## Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**\$ 7.100 millones**

### Avance:

- ✓ Se realizó la entrega de:
  - **3 licencias** de emisoras comunitarias.
  - **226 becas** en TI- competencias técnico laborales
  - **4.500 computadores** para educar
- ✓ Se apoyo en la creación de **318 MiPymes** conformadas en TIC.
- ✓ Se instalaron **4 zonas WIFI**.
- ✓ Se identificaron **11.591 estudiantes** a ser beneficiados de **37 sedes educativas**.

### Compromisos:

- **Instalación de 2 zonas WIFI:** Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018.
- **Despliegue de televisión digital terrestre:** Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. **Plazo: Febrero de 2018.**
- **Instalación de punto Vive Digital:** Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del Putumayo. **Plazo: Junio de 2018.**





SECTOR  
**SALUD**

---

## Construcción y Dotación Hospital José María Hernández

\$ 33.826 millones

### Avance:

✓ **33,76%** de avance físico en la obra.

**Fecha de  
Finalización:**

Marzo de 2020



### Compromisos:

- Definir los proyectos biomédicos a desarrollar.
- Elaborar el cronograma de la obra.
- Establecer la viabilidad de los recursos.

SECTOR  
**AMBIENTE**

---

## Avance:

- ✓ Mesa técnica ambiental en funcionamiento.
- ✓ Corpoamazonia presentó, dentro del marco de la mesa técnica ambiental, la propuesta de la etapa de estudios del eje ambiental y diseños de la ronda hídrica, avaluados en \$ 3.000 millones, **los cuales serán financiados con donaciones.**
- ✓ Se presentó al DNP el proyecto de obras de mitigación y reducción del riesgo, avaluado en \$130 mil millones para revisión.
- ✓ Durante la semana del 15 al 18 de enero el Ministro de Ambiente realizó visita a las zonas afectadas en Mocoa para evaluar y verificar necesidades.



## Avance:

- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato.
- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas urbanas y suburbanas.
- ✓ Avances en un 80% en microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.

## Compromisos:

- Entregar fotografías. **Plazo: Enero de 2018.**



SECTOR  
**PLANEACIÓN**

---

## Revisión y ajuste del PBOT + estudios de riesgos

PROGRAMA  
**POT  
MODERNOS**

Valor:

**\$ 4.886\* millones**

\* Incluye estudios de riesgos

Tiempo de  
ejecución:

**9 meses**

### Actividades adicionales del DNP

- ✓ **Elaboración del documento CONPES 3904:**

PLAN PARA LA  
RECONSTRUCCIÓN  
DE  
**MOCOIA**  
2017 - 2022

**Valor estimado: \$1.2  
billones**

**122 acciones (infraestructura,  
desarrollo social, económico  
e institucional, conectividad  
e integración regional,  
ordenamiento territorial)**

- ✓ **Apoyo permanente a la Gerencia**
- ✓ **Apoyo para la actualización del Plan de  
Desarrollo Municipal**

- ✓ **11 de diciembre de 2017:** Presentación del Enlace Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa).
- ✓ **19 de diciembre de 2017:** visita a centros nucleados con INYPSA.
- ✓ **5 de enero a la fecha:** equipo de riesgos en campo recolectando información y visitando las principales fuentes hídricas.
- ✓ **11 de enero de 2018:** socialización de la estrategia de participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA.



- ✓ **Otras actividades en curso:**
  - Identificación, recolección y clasificación de la información disponible.
  - Análisis de información básica de riesgos.
  - Consecución y adecuación de la sede en Mocoa.
  - Reuniones semanales con la Alcaldía y Corpoamazonia.

SECTOR  
**COMERCIO**

---

## Recuperación del comercio y la actividad productiva

### Reactivación de 170 Negocios Formales:

**Valor:**

**\$ 4.250 millones**

**Tiempo de  
ejecución:**

Primera Fase: 6 a 8 meses  
(Julio 2017 a febrero de 2018)  
Segunda Fase: 6 a 8 meses  
(Noviembre 2017 a junio de 2018)

**Avance:**

- ✓ \$3.000 Millones en ejecución para 120 Negocios iniciales.. A la fecha solo faltan 20 negocios por terminar entrega de apoyos en equipos, maquinarias e inventario.
- ✓ Está en proceso de contratación un cuarto proyecto para reactivación de 50 negocios adicionales.

### Cofinanciación: Bancoldex - FNG

- ✓ Línea de Crédito Bancoldex: **Desembolsos por \$ 16.317 Millones** a intermediarios financieros, representados en 326 operaciones y **más de 2.842 beneficiarios.**
- ✓ Garantías – FNG: \$11.003 millones en 581 créditos garantizados.



### Comunidades indígenas:

- ✓ En ejecución: Fortalecimiento productivo y comercial de **5 cabildos. Inversión \$250 Millones.**
- ✓ Encuentro regional de Economías Propias MOCOA – Feria de Negocios del 09 al 11 de Nov/17.  
Comunidad Simuyaco - \$ 20 millones
- ✓ Turismo: Ingresos confirmados por valor de \$60 millones, beneficiando a 150 personas.
