

# AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

## RECONSTRUCCIÓN MOCOCHA

09 DE ENERO DE 2018



MINDEFENSA



## EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

## MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



## PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

## INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averiados	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3

## ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

## PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas  
**120 Reuniones Realizadas**

Miembros del SNGRD que operaron  
**Más de 2.300**

Personas Atendidas en los Puesto de Información  
**Más de 10.000**

## ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina) Incluidas las Donaciones de la Primera Dama, Empresas Privadas y Comunidad  
**2.540 Toneladas Entregadas**

## APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados  
**297 Fallecidos**

**FASE DE RESPUESTA**  
**100%**  
**EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN**



## SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela)  
**57.945**

Vacunas Aplicadas Animales  
**1.639**

## ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional  
**100%**

## TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos  
**100%**



## AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados	<b>Más de 88 millones</b>
Litros de Agua Entregados por Día	<b>1 millón</b>

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

**Hoy 3 Carrotanques se encuentran disponibles**

## ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los Albergues	<b>4.561</b>
Albergues que fueron Habilitados y Administrados	<b>9</b>

## SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados	<b>4.448</b>
----------------------------------	--------------

**Valor Subsidios: \$10.200 millones**  
**Hasta junio de 2018**

## FASE DE ESTABILIZACIÓN

**100%**  
**90 días**



*Familias Albergue el Pepino*

## Transporte y traslados

Personas que fueron trasladadas a otras ciudades con el apoyo de Cancillería y OIM	<b>765</b>
--	------------

## MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

**Se utilizaron 51.642 Horas Máquina** para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

## INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

## AGUA

Bocatomas en Rehabilitación **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable terminada (Suroccidente) **1**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro, Barrios Unidos y Norte) **3**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico- MinVivienda, Logística- Ejército Nacional

## COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA

## EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**



## CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños	<b>2.056</b>
Jornadas Socioculturales	<b>61</b>

## AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente)	<b>1</b>
---	----------

## EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de Escombros, Manejo de Maquinaria, )	<b>270</b>
--	------------

## NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y Madres Gestantes	<b>47 Toneladas entregadas</b>
--	--

### CONTINUAMOS EN ...

- Subsidio de Arriendo para propietarios de vivienda destruida.
- Suministro de Agua en Carrotanques.
- Fortalecimiento Institucional del Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

**INSTALACIÓN DE LA  
OFICINA DEL  
GOBIERNO NACIONAL  
PERMANENTE EN  
MOCOA - OGN**

## Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD

Cuenta Davivienda No. **021666888**

Donaciones Nacionales	\$9.975.197.236
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	\$ 27.223.170.323
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37.198.367.559</b>

CHINA	\$ 2.854.900.000
EMIRATOS ARABES	\$ 19.690.929.675
TURQUÍA	\$ 430.250.000
BANCO CENTROAMERICANO	\$ 718.375.000
BID	\$ 569.200.000
CAF	\$ 285.765.000
KEYCOFFEE	\$ 26.378.087
MITSUBISHI	\$ 131.890.436
KEIMYUNG CARITAS (SOUTH KOREA)	\$ 12.840.994
DINAMARCA	\$ 130.434.782
USA PEEC	\$ 72.566.250
CARING FOR COLOMBIA	\$ 122.793.200

BOOYOUNG HOUSING CO LTD (SOUTH KOREA)	\$ 294.796.029
LIG NEX1 CO.,LTD.	\$ 59.340.000
TAILANDIA	\$ 292.820.000
GIFU BROADCASTING	\$ 2.641.578
COREA	\$ 871.950.000
WORLD TRADE ORGANIZATION	\$ 9.460.391
HYUNDAI	\$ 293.170.000
COLOMBIANOS EN ALEMANIA	\$ 8.071.446
PERSONAS EN EL EXTERIOR	\$ 171.230.788
GIVE TO COLOMBIA	\$ 173.366.667

## Asignación o Compromiso de Recursos

Uniformes estudiantes de Mocoa*	\$ 727,593,000
Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II	\$ 8,500,000,000
Adquisición del predio para la Fase I de construcción de vivienda Rural	\$ 1,907,820,000
Escrituración del Predio Sauces*	\$ 9,637,000
Adquisición del predio para la Fase II de construcción de vivienda Rural*	\$ 1,185,665,880
Estudios y diseños técnicos para la construcción de la vivienda de interés prioritario (Interventoría) *	\$ 1,455,032,040
Asistencia Humanitaria de Emergencia*	\$ 569,200,000
Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva*	\$ 1,700,000,000
Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva*	\$ 400,000,000
Pavimentación de vías urbanas *	\$ 5,000,000,000
Mejoramiento de instalaciones Educativas e instalación de equipos *	\$ 290,000,000
Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa	\$ 122.793.200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil	\$ 173.366.667
<b>TOTAL ASIGNADO</b>	<b>\$ 22.041.107.787</b>
<b>POR ASIGNAR</b>	<b>\$ 15.157.259.772</b>

- *Estos valores cambian de acuerdo al estudio de mercado y uso de suelo.*
- *Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar.*



DONANTE	DESCRIPCIÓN
Amerisur	Contenedor nevera para conservación de cadáveres
Telefónica-Movistar	15 teléfonos Nokia 3500 Negros
Bettina Spitz	7 cajas con prendas de vestir femeninas
DICORP	5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de palma
Shelterbox	63-Cajas Shelterbox
Global Medic	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión
Asecones	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital
Gobierno de Japón	30 Generadores eléctricos de 60 Hz
Eduardoño	1 planta eléctrica
Gobierno de Turquía	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares
Skinco Gyplac	3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L
Terpel	600 galones de ACPM para vehículos y plantas eléctricas
Fundación Éxito	Viveres para Asistencia Humanitaria
Colempaques	421 Tanques de Almacenamiento de Agua 126 canecas plásticas para las viviendas



*Donación Colempaques*

**TOTAL DONACIONES EN ESPECIE**  
**\$668 Millones**

SECTOR  
**VIVIENDA**

---



## 1.461

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR

1.209 Viviendas Urbanas  
252 Viviendas Rurales



## VIVIENDA URBANA

• **Fase 1:** En Construcción 300 viviendas (Los Sauces I)

\$ 22.260 millones

- ✓ Área de cada vivienda: 64 m<sup>2</sup>
- ✓ 3 hectáreas predio Sauces I

## AVANCE

- ✓ 99% de los estudios y diseños (9 de 10 lotes)
- ✓ 100% en el cambio de la red de acueducto
- ✓ 80% en preparación del terreno
- ✓ 15,3% de ejecución física
- ✓ Avance de obras en el primer nivel de la Manzana E y levantamiento de paredes del segundo nivel

## COMPROMISOS...

- Primeras 100 viviendas para febrero 2018.
- Plan de Choque para garantizar el cumplimiento del cronograma de la ejecución del proyecto.
- Postulación de las familias.
- Servicios públicos del Predio.
- Fecha de finalización 11 de mayo: 300 casas



Tiempo de ejecución: 1 año - (mayo 2017- mayo 2018)

## VIVIENDA URBANA

### • Fase 2:

**Construcción 909 viviendas  
(Sauces II) \$60.448 millones**

**Predio Sauces II.**

- ✓ **Área del predio: 16.93 Hectáreas**

## AVANCE

- ✓ Se realizó el proceso de toma de posesión del Predio y registro del acta en instrumentos públicos.
- ✓ Asignación de los recursos para la ejecución de las 909 viviendas.
- ✓ Otro sí perfeccionado
- ✓ Se remitieron invitaciones para cotizar para la ejecución de la obra, plazo máximo de remisión de propuestas 15 de enero de 2018.

**Tiempo de  
ejecución:**

**1 año y seis meses –  
(Diciembre 2017-junio 2019)**




## COMPROMISOS...

- Respuesta a recursos de reposición.
- Escrituración del predio a nombre del FNGRD
- Primeras 300 casas para agosto 2018
- Proceso de nuevo lote en enero de 2018
- Definición de Diseños

**1. Centro Regional de Atención a Víctimas**  
 Unidad de Víctimas

**2. Colegio Saucés II**  
 MinEducación-UNGRD  
 Estructuración de obra e interventoría Junio 2019.

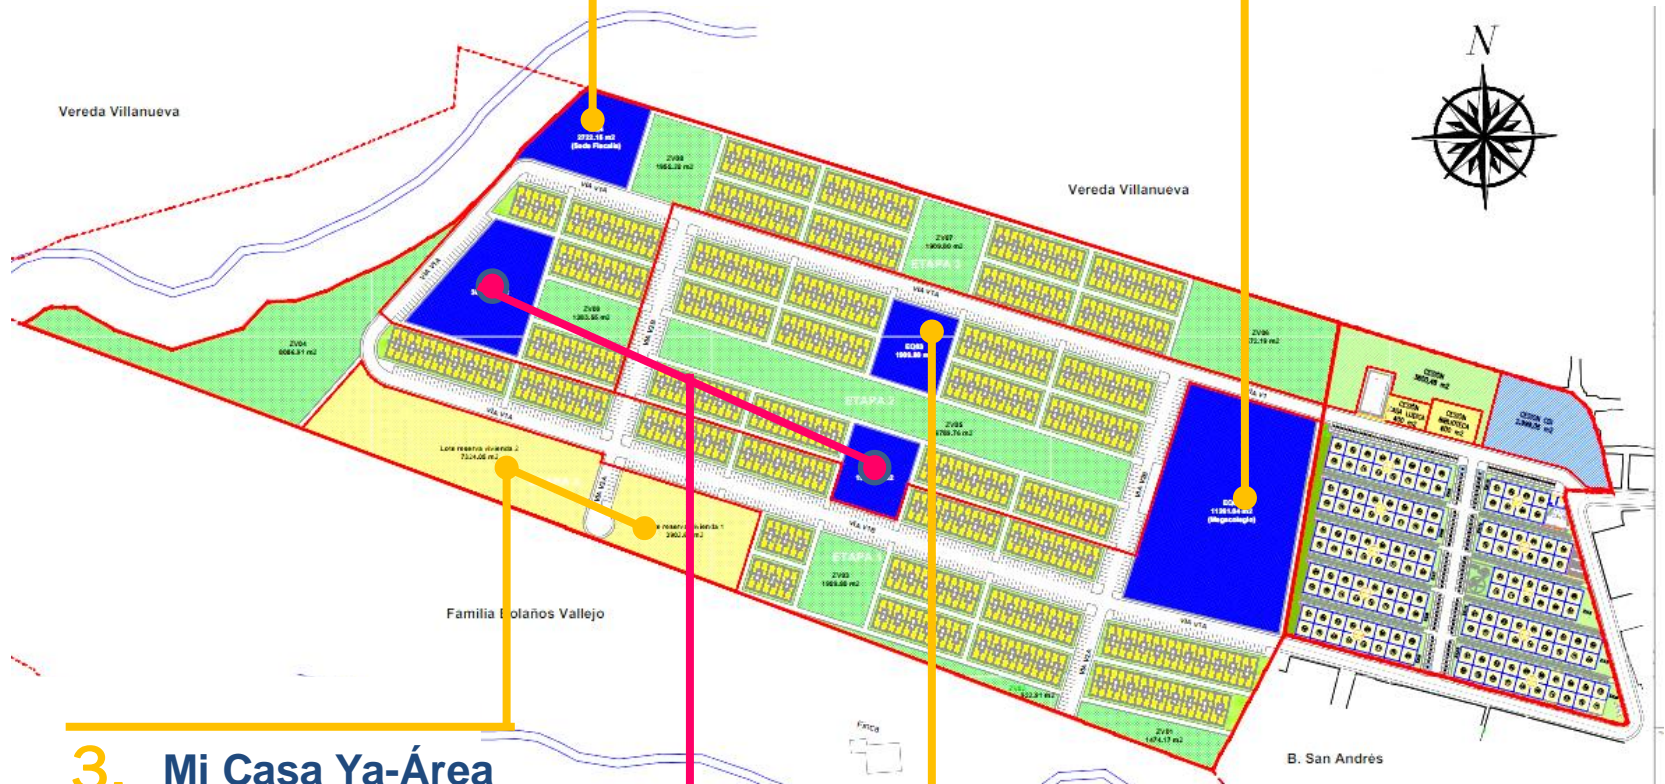

**3. Mi Casa Ya-Área Disponible**  
 MinVivienda

**Espacios Disponibles**

**4. Centro de Integración Ciudadana**  
 MinInterior  
 Aporte de recursos  
 Revisión de insumos técnicos

## ACUEDUCTO

### AVANCE

- ✓ El 8 de noviembre se dio inicio a las obras de redes de distribución, de acuerdo con la reprogramación realizada. Se tiene un avance de 3.222 metros tubería PVC D=3,4,6" en las zonas 1,2 y 4 del casco urbano.
- ✓ El 13 de diciembre el contratista inicio trabajos preliminares en la Bocatoma y Desarenador.
- ✓ El 16 de diciembre se radicó documento de propuesta final por parte del Gobierno Nacional ante el cabildo INGA, esperando protocolización de la consulta el 30 de enero de 2018. Con lo que se estima iniciar obras el 1 de febrero de 2018.
- ✓ Se acordó realizar la Consulta Previa e iniciar con la ejecución de la obra, se definió ruta metodológica.
- ✓ **5%** avanece en obras, estudios y diseños línea de conexión 5.000 metros

- **Construcción del Acueducto-  
Viceministerio de Agua**

**\$28.074 millones**

### COMPROMISOS...

- Proyección obras preliminares en Bocatoma

## ALCANTARILLADO

### AVANCE

- ✓ Operación aprobada en Comisión Interparlamentaria el 6 de diciembre.
- ✓ Aprobación en el Directorio del BID el 13 de diciembre.

- **Plan Maestro de Alcantarillado**

**\$91.200 millones**

### COMPROMISOS...

- CREDITO BID: Operación aprobada, en revisión minuta del Préstamo.
- Diseños entregados para la vigencia 2018, y ejecución para el 2019 y 2020.

## CRONOGRAMA

COMPONENTE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	CONSULTA PREVIA		OBSERVACIONES
			SI	NO	
<b>BOCATOMA</b>	13/12/2017	12/03/2018		X	DISEÑOS APROBADOS POR INTERVENTOÍA Y AVALADOS POR FINDETER EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017. EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES
<b>LINEA DE ADUCCIÓN</b>	22/12/2017	06/02/2018		X	DISEÑOS HIDRAULICOS APROBADOS. SE RERQUIEREN RECURSOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS
<b>DESARENADOR</b>	03/12/2017	17/01/2018		X	SE ADELANTAN ACTIVIDADES PRELIMINARES (LOCALIZACIÓN - REPLANTEO; CAMPAMENTO)
<b>LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA</b>	18/01/2017	17/03/2018	X		DISEÑOS HIDRAULICOS APROBADOS. SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 800 m EN EL TERRITORIO DEL RESGUARDO INGA. SE REQUIEREN RECURSOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS
<b>PTAP</b>	22/12/2017	22/05/2018	X		DISEÑOS APROBADOS. SU IMPLANTACIÓN SE ENCUENTRA EN ZONA DEL RESGUARDO INGA
<b>ESTRUCTURA DE LODOS</b>	22/12/2017	21/02/2018	X		
<b>LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA</b>	09/12/2017	26/06/2018		X	DISEÑOS HIDRAULICOS APROBADOS. PARA LAS LINEAS SUROCCIDENTE Y NORTE, SE REQUIEREN RECURSOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS.
<b>TANQUE No. 1 V= 927 m3</b>	22/12/2017	22/05/2018	X		DISEÑOS APROBADOS. SU IMPLANTACIÓN SE ENCUENTRA EN ZONA DEL RESGUARDO INGA
<b>TANQUE No. 2 V= 1.533 m3</b>	28/12/2017	28/06/2018		X	DISEÑOS HIDRAULICOS APROBADOS. SE REQUIEREN RECURSOS ADICIONALES PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS DEFINITIVOS.
<b>REDES DE DISTRIBUCIÓN</b>	09/11/2017	20/04/2018		X	EN EJECUCIÓN DE OBRAS. SE HAN EJECUTADO APROXIMADAMENTE 3.720 m DE TUBERÍA PVC 2,3,4 Y 6"

## • Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los Sauces I - MinVivienda

\$ 3.500 millones

### AVANCE

- ✓ Identificación de 300 niños
- ✓ Adjudicación contrato de obra y de interventoría
- ✓ Se adelantaron los estudios y diseños.
- ✓ Se realizó la topografía.
- ✓ Se realizará la dotación con la Donación de Give To Colombia.

Fecha terminación:

Julio 2018

### COMPROMISOS...

- **Minvivienda:** Entregar cronograma.





SECTOR  
**AGRICULTURA**

---

## • Construcción 252 viviendas

\$16.390 millones

### AVANCE

- ✓ Identificación de 252 familias beneficiarias
- ✓ Aprobación de recursos 100% de Min- Agricultura
- ✓ La Alcaldía definió nuevo predio en la vereda Planadas de 26 hectáreas, para la totalidad del proyecto.
- ✓ Decreto de modificación de densidades expedido
- ✓ IGAC realizó visita al predio para levantamiento topográfico.

Tiempo de ejecución:

1 año y 5 meses

Firma Convenio: 10 de Octubre 2017

Fecha proyectada para terminar: Marzo de 2019



Vereda Planadas - Predio La Cabaña.



### COMPROMISOS...

- **IGAC:** Entrega avalúo catastral
- Revisar servicios públicos (agua y energía)
- Desembolso de los recursos del Banco Agrario a la UNGRD.
- Adquisición del Predio por parte de la UNGRD en el mes de enero 2018

## VIVIENDA RURAL

### AVANCE

- **Mejoramiento de 300 viviendas –MinAgricultura**

**\$ 6.220 millones**

✓ La Alcaldía remitió listado de potenciales familias .

### COMPROMISO...

✓ Se presentará en la próxima comisión de vivienda para la distribución de los recursos correspondientes para la vigencia 2018: «*Programas Estratégicos Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural*».

## ACTIVACIÓN SECTOR AGROPECUARIO

### AVANCE

- ✓ Definición de las **180 familias** a ser beneficiadas entre la Alcaldía y el Ministerio de Agricultura.
- ✓ Se presentó el Plan Operativo en comité de supervisión.
- ✓ Convenio perfeccionado

### COMPROMISOS...

- Desembolso del Ministerio a la UNGRD.

- **Reactivación Económica para 180 familias- Alcaldía y MinAgricultura**

**\$1.020 millones**

**Tiempo de ejecución:**

**6 meses**  
(noviembre 2017 a mayo de 2018)

SECTOR  
**PROSPERIDAD SOCIAL**

---

## VIVIENDA URBANA

### AVANCE

- ✓ Convenio con operador UNOPS
- ✓ Identificadas 220 viviendas por la Alcaldía
  
- ✓ **1ra Etapa-120 viviendas: (3.5 meses)**
  - Aprobación del comité de estructuración: 20 de noviembre de 2017.
  - Socialización con la comunidad del proyecto el 21 de diciembre de 2017
  - Inicio de Obra: 1 de diciembre 2017 ( 25 viviendas en 20 días).
  
- ✓ **2da Etapa-100 viviendas: (3 meses)**
  - Pendiente aprobación del comité de estructuración: 15 de diciembre de 2017.
  - Socialización con la comunidad del proyecto el 21 de diciembre de 2017
  - Inicio de Obra: 15 de diciembre 2017
  
- ✓ **3da Etapa-80 viviendas: (2.5 meses)**
  - Pendiente aprobación del comité de estructuración: Por definir
  - Socialización con la comunidad : Por definir
  - Inicio de Obra: Por definir

- **Mejoramiento de 300 viviendas  
Prosperidad Social**

**\$4.972 millones**

**Tiempo de ejecución:** 9 meses - (27 noviembre 2017 a Agosto 2018)

### COMPROMISOS...

- Desembolso del Ministerio a la UNGRD.
- **1ra Etapa-** Socialización con la comunidad del proyecto en enero de 2018 y ubicar a las familias.
- **2da Etapa** - Socialización con la comunidad del proyecto en febrero 22018.

## • Construcción plaza de mercado \$8.100 millones

### AVANCE

- ✓ **FASE 1 (UNGRD) - \$ 2.000 millones**
  - **Componente 1: (\$400 millones)**
    - Se realizó la posesión del predio.
    - Se realizó inscripción del Acta de Posesión en la oficina de Instrumentos Públicos.
  - **Componente 2: (\$1.700 millones)**
    - Estudios y diseños
    - Obras de adecuación de acceso
    - Obras de conexiones a servicios públicos
    - 2 hectáreas a adquirir
- ✓ **FASE 2 (Prosperidad Social) - \$ 6.000 millones**
  - Construcción (\$6.000 millones)
  - Se suscribió el Convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD-14 diciembre 2017.



### COMPROMISOS...

- Respuesta a recursos de reposición
- Planta de tratamiento de aguas residuales.

**Tiempo de  
ejecución:**

**2 años y 5 meses -  
(diciembre 2017 a marzo de 2020)**

SECTOR  
**EDUCACIÓN**

---



## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- **Construcción y mejoramiento de sedes educativas**

**\$29.000 millones**

## AVANCE

- **Construcción del colegio ubicado en el predio los Sauces II - UNGRD, con apoyo MinEducación.**

- ✓ Se firmo el convenio entre el MinEducación y la UNGRD.
- ✓ Se beneficia a mas de 3.000 niños.

Tiempo de Ejecución: 16 meses (noviembre 2017 a marzo de 2019).

- **Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación**
  - ✓ Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Mayo de 2018.Finaliza: Diciembre 2018
- **Mejoramiento de 9 sedes educativas– MinEducación**
  - ✓ Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Marzo de 2018Finaliza: Agosto 2018

## COMPROMISOS...

- Estructuración de contrato de obra e interventoría
- **MinEducación:** Entregar información actualizada y detallada.
- Fecha de Finalización: Junio 2019

**Más de 3.000 niños beneficiados**

SECTOR  
**CULTURA**

---

## OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

### • Construcción Biblioteca-MinCultura

\$ 391 millones

### AVANCE

- ✓ Ministerio de Cultura realizará la dotación.
- ✓ Embajada de Japón realizará la construcción.
- ✓ Se adelanta las actividades de movimiento de tierras y cimentación.
- ✓ **22%** de avance de obra

**Inicio de obras:** 5 de Diciembre 2017

**Finalización:** Marzo 2018



SECTOR  
**CANCILLERÍA**

---

## OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

- **Construcción Casa Lúdica- Cancillería  
Los Sauces I**

**\$ 600 millones**

### AVANCE

- ✓ Se adelantaron los estudios y diseños.
- ✓ Se adelantará la socialización con la comunidad y las autoridades locales el día 28 de noviembre de 2017.
- ✓ **Inicio de Obra:**  
Enero de 2017.
- ✓ **Tiempo de construcción:**  
4.5 meses

### COMPROMISOS...

- **Alcaldía:** En trámite licencia de construcción y diseños

- **Construcción de Espacio Deportivo-Cancillería**

### AVANCE

**\$ 99 millones**

- ✓ Convenio entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería perfeccionado.

**Inicio de Obra:** Enero 2018

**Finalización:** Marzo 2018

SECTOR

# GESTIÓN DEL RIESGO

---

## • Construcción de 4 puentes peatonales

\$ 348 millones

- ✓ **Puente Mulato:** Terminado 100%
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel:** Terminado 100%
- ✓ **Puente Dantayaco Vereda San José del Pepino:** Terminado 100%
- ✓ **Puente San Agustín:** Se realizó la visita técnica para la definición del punto.

**Fecha de entrega:** Febrero 2018 del punto.



*Puente Dantayaco*



*Puente Mulato*



*Puente Villa Rosa – San Miguel*

## • Pavimentación de 2.8 Kms de vías

### AVANCE

\$5.000 millones

4 tramos terminados  
1 tramo en ejecución

10 % de avance en obra

283 metros de vía pavimentada de 2.800 mts  
proyectados

- ✓ **Vía Victoria Regia**-Intervención de 110 ml
  - Pavimentación del 100%
- ✓ **Vía Pablo VI** -intervención de 126 ml
  - Pavimentación 100%.
- ✓ **Vía La Brigada**-intervención de 190 ml
  - Obras preliminares 5%.

### COMPROMISO...

- La Alcaldía debe suministrar los diseños de las 17 vías faltantes a intervenir.

Tiempo de ejecución:

18 meses  
(Octubre 2017 a Marzo 2019)



Tramo Victoria Regia



Tramo Pablo VI



- **Instalación del SAT**  
**\$1.223 millones**

- ✓ **100%** avance en la implementación del SAT  
**Finaliza: 30 de diciembre de 2017.**

- **SAT Comunitario**  
**\$205 millones**

- ✓ **93%** de avance  
**Finaliza: 30 de enero de 2018.**

- **Estudios y diseños SAT**  
**\$600 millones**

- ✓ **72%** de avance
- ✓ **Finaliza: 30 de enero de 2018.**



## \$360 millones

### Actividades a realizarse:

- ✓ Filtros
- ✓ Adecuación y nivelación de terrenos
- ✓ Construcción de parque infantil
- ✓ Rehabilitación del salón social

## AVANCE

- ✓ **98%** avance de actividades
- ✓ Instalación de la Grama y acabados salón comunal.



### COMPROMISO...

- Entrega de la cancha en el mes de Enero de 2018

Tiempo de  
ejecución:

**3 meses**  
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017)

## MEDIOS DE VIDA

**Responsable:**  
**UNGRD**

**INVERSIÓN:**  
**\$ 351 millones**

- ✓ **60 medios de vida entregados** para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.

## SUBSIDIOS DE ARRIENDO

**Responsable:**  
**UNGRD**

**INVERSIÓN:**  
**\$ 10.200 millones**

**7.175** Subsidios otorgados a la fecha  
**1.485** Primera Prorroga  
**1.186** Segunda Prorroga

«Los subsidios se cancelan a los beneficiarios hasta la entrega de la solución de vivienda»  
Próxima prorrogga en enero de 2018.



## ASISTENCIA HUMANITARIA

**1.218** Primera Entrega (Octubre)  
**1.060** Segunda Entrega (Noviembre)  
**972** Tercera Entrega (Diciembre)

### 3.585 kits de asistencia humanitaria

entregados a las familias afectadas y registradas en el RUD, que reciben subsidio de arriendo



## COMPROMISO...

- Siguiete entrega de AHE del 12 al 13 de enero de 2018

## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

### Actividades a realizarse:

- ✓ Cubierta
- ✓ Adecuación de placa deportiva

## AVANCE

- ✓ Convenio marco firmado entre UNGRD-Colegio
- ✓ Se suscribió el contrato de obra y acta de inicio.
- ✓ Inicio de Obras desde el 18 de diciembre de 2017.
- ✓ Fundición de Zapatas para estructura de cubierta y zona de tarima.
- ✓ **8%** de avance en la adecuación

## COMPROMISO...

- Suscripción contrato de adquisición de material académico

- **Adecuación Colegio Ciudad Mocoa**  
**\$290 millones**
- Donación de Caracol TV (Yo me llamo)
- Adecuación del Laboratorio de Ciencias Naturales y la dotación de la Banda de Paz (Caring for Colombia)



SECTOR  
**INFRAESTRUCTURA VÍAL**

---

## PUENTES VEHÍCULARES

### 1. Puente sobre el río Sangoyaco - Terminal

- ✓ En etapa de preconstrucción (Estudios y Diseños)
- ✓ Responsable: INVIAS

### 2. Puente sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia

- ✓ Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de recursos adicionales del INVIAS
- ✓ Responsable: INVIAS **SIN RECURSOS**


### 3. Puente sobre el río Sangoyaco - Terminal

- ✓ Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de recursos adicionales del INVIAS
- ✓ Responsable: INVIAS **SIN REVISOR**

### 4. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Contrato en ejecución Concesión Santana-Mocoa- Neiva
- ✓ Fase de Estudios y Diseños completada
- ✓ Proyección de inicio de obras febrero 2018
- ✓ Responsable: ANI

- 4 puentes vehiculares  
\$9.700 millones

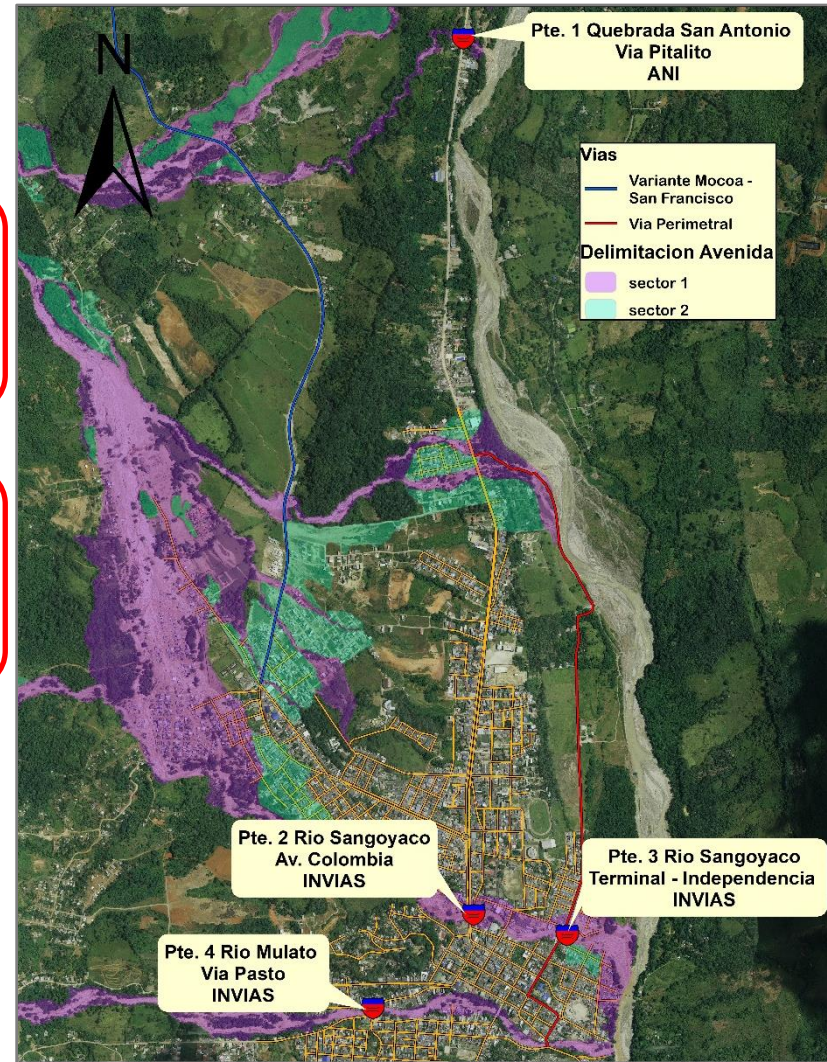

## MAQUINARIA Y EQUIPO

### AVANCE

✓ Priorización de maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía:


- 1 Bulldozer
- 2 Carrotanques
- 1 Retroexcavadora
- 1 Motoniveladora
- 1 Vibrocompactador
- 1 Vactor

### COMPROMISO...

- Asignación de Recursos al INVIAS por valor de \$4 mil millones (MinHacienda)

- **Combo de Maquinaria Amarilla-INVIAS**

**\$ 5.000 millones**

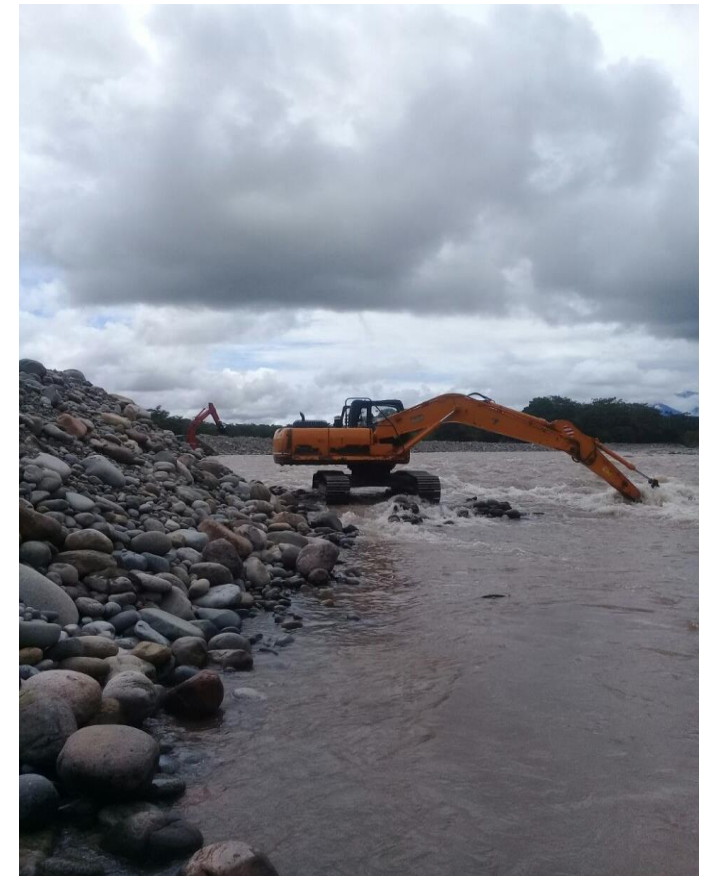

SECTOR  
**ENERGIA**

---



- **Construcción de Subestación eléctrica Definitiva RENACER**

**Etapas 1:** Funcionamiento de operación móvil, que esta en funcionamiento

**Etapas 2:** Restablecimiento provisional subestación Junín: 5% de Avance y se termina en mayo de 2018.

**Etapas 3:** Construcción nueva subestación Renacer:  
✓ Etapa de prediseño y definición de ubicación.

**\$45.000 millones**



**COMPROMISO...**

- Cronograma de ejecución

**3 años - MINMINAS**

- **Subsidios al Consumo de energía eléctrica**

Subsidios 100% consumo a estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Mocoa registrados en el R.U.D por 6 meses.

**\$1.522 millones**

**COMPROMISO...**

- Envío del listado de beneficiarios - Empresa de Energía del Putumayo



## CRONOGRAMA FASE II, RESTABLECIMIENTO DE SUBESTACIÓN JUNÍN

Item	Actividad	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	Replanteo e Ingeniería de restablecimiento Fase II SE Junín	20-dic-17	30-dic-17
2	Limpieza de: equipos de patio, carcamos, banco de ductos y sala de control	20-dic-17	13/01/2018
4	Instalacion de tableros de control y protecicones	11-dic-17	3-feb-18
3	Tendido y conexonado de cableado de control a equipos de potencia y tableros de protecciones	25-dic-17	3-mar-18
5	Instalación de Equipo Electrógeno y tablero de Servicios Auxiliares	22-ene-18	31-mar-18
6	Prueba y amarillado de planos	26-feb-18	21-abr-18
7	Puesta en servicio	26-feb-18	19-may-18

**TIEMPO TOTAL ESTIMADO 6 MESES**



## CRONOGRAMA FASE III, CONSTRUCCIÓN NUEVA SUBESTACIÓN

ÍTEM	HITO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	Gestión ambiental	Elaboración de estudios ambientales previos	dic-17	ene-18
2	Gestión ambiental	Estudio de Impacto Ambiental - EIA	feb-18	jul-18
3	Gestión ambiental	Evaluación EIA y licenciamiento	ago-18	nov-18
4	Gestión ambiental	Ejecución del Plan de Manejo Ambiental	dic-18	ene-19
5	Gestión Social	Compra del predio	dic-17	may-18
6	Gestión Subestación	Estudios civiles previos	ago-18	sep-18
7	Gestión Subestación	Diseños de ingeniería conceptual, básica y de detalle y AUI	abr-18	sep-18
8	Gestión Subestación	Compra de equipos	ago-18	feb-19
9	Gestión Subestación	Obras Civiles	oct-18	mar-19
10	Gestión Subestación	Obras Eléctricas	abr-19	abr-20

**TIEMPO TOTAL ESTIMADO 2 AÑOS Y 4 MESES**

SECTOR  
**TELECOMUNICACIONES**

---

## AVANCE

- 3 Licencias de Emisoras Comunitarias
- 200 Becas Talento Tecnología de la Información

## EN PROCESO

- **Despliegue de Televisión Digital Terrestre**
  - ✓ Se realizará la entrega de 2.500 decodificadores de TDT.
  - ✓ Instalación de antenas en Enero

**Tiempo de ejecución:** Enero 2018

- **Instalación de Punto Vive Digital**
  - ✓ Instalación del Punto Vive Digital en el Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP

**Tiempo de ejecución:** 2018

**\$ 2.984 millones**

- Se entregaron **4.500 computadores para educar y 6 zonas WIFI**
  - 11.591 estudiantes beneficiados
- Para 37 sedes educativas



SECTOR  
**SALUD**

---

## • Construcción y dotación Hospital José María Hernández

**\$ 33.826 millones**

✓ Se adelanta la construcción del Hospital con un avance físico del **33.76%**

**Tiempo de ejecución:**

**Marzo 2020**



### **COMPROMISO...**

- Proyectos biomédicos
- Definir fecha de inicio de la construcción.
- Definir la designación de los recursos por parte del Ministerio de Salud.

SECTOR  
**AMBIENTE**

---



- ✓ Mesa técnica ambiental sigue funcionando
- ✓ IGAC adelanta fotocontrol para elaborar y suministrar ortofoto necesaria para la modelación por SGC.
- ✓ Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA y Ministerio de Ambiente adelantan modelación.
- ✓ Mediante Resolución No. 1336 de octubre 9 de 2017, Corpoamazonia estableció los determinantes ambientales para la formulación, revisión o modificación del PBOT de Mocoa.
- ✓ MADS y Corpoamazonia trabajan para presentar obras de mitigación y reducción del riesgo.

## COMPROMISOS MADR...

- Elaborar documento ejecutivo de valor de caña.
- Obras de Mitigación
  - Perfiles de Donaciones
  - Estudios y Diseños



## Servicio Geológico Colombiano



- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato.
- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas urbanas y suburbanas.
- ✓ Avances en un 70% microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.

## COMPROMISOS...

- Fotografías para enero 2018.

SECTOR  
**PLANEACIÓN**

---

## • Revisión y ajuste del PBOT + Estudios de Riesgos



PROGRAMA  
**POT  
MODERNOS**

Valor:

**\$ 4.886\* millones**

\* Incluye estudios de riesgos

Tiempo de  
ejecución:

**9 meses**

### Actividades adicionales del DNP

- ✓ Apoyo permanente a la Gerencia
- ✓ Apoyo para la actualización del Plan de Desarrollo Municipal
- ✓ Contratación de un enlace entre el DNP y el municipio.

## • Documento CONPES 3904

- ✓ Aprobación el 31 de octubre el CONPES: Plan para la reconstrucción de Mocoa para el período 2017-2022
- ✓ **Valor Conpes: 1.2 billones**
- ✓ Se realizó la socialización del CONPES a la Alcaldía

- ✓ Firma de convenio entre Alcaldía y POT Modernos (3 de agosto)
- ✓ **Fase de pre-alistamiento:**
  - Conformación del Comité Técnico Ambiental y de Riesgos
  - Apoyo a entidades nacionales para identificar y viabilizar suelo disponible en el corto plazo
  - Capacitación en temas de ordenamiento a personal local y comunidad
  - Coordinación con SGC para la definición de alcances de estudios de riesgos
- ✓ **Fase de alistamiento:**
  - Identificación, recolección y clasificación de la información disponible
  - Visitas de campo
  - Consecución y adecuación de la sede en Mocoa
- ✓ **Operador seleccionado:** Consorcio INYPSA-ARCGEA-ACCEPLAN-GRUPO UR
  - Equipo PBOT & de riesgos definido
- ✓ 6 líneas estratégicas
- ✓ 122 proyectos

SECTOR  
**COMERCIO**

---

## Recuperación del comercio y la actividad productiva

### Reactivación de 170 Negocios formales:

**Valor:**

**\$ 4.250 millones**

Primera Fase: 6 a 8 meses  
(Julio 2017 a febrero de 2018)  
Segunda Fase: 6 a 8 meses  
(Noviembre 2017 a junio de 2018)

**Tiempo de ejecución:**

**Avance:**

- ✓ \$3.000 Millones en ejecución para 120 Negocios iniciales.. A la fecha solo faltan 20 negocios por terminar entrega de apoyos en equipos, maquinarias e inventario.
- ✓ Está en proceso de contratación un cuarto proyecto para reactivación de 50 negocios adicionales.

### Cofinanciación: Bancoldex - FNG

- ✓ **Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por 16.317 Millones** a intermediarios financieros, representados en 326 operaciones y **más de 2.842 beneficiarios.**
- ✓ **Garantías – FNG: \$11.003 millones** en 581 créditos garantizados.



### Comunidades indígenas:

- ✓ En ejecución: Fortalecimiento productivo y comercial de **5 cabildos. Inversión \$250 Millones.**
- ✓ Encuentro regional de Economías Propias MOCOA – Feria de Negocios del 09 al 11 de Nov/17.  
Comunidad Simuyaco - \$ 20 millones
- ✓ Turismo: Ingresos confirmados por valor de \$60 millones, beneficiando a 150 personas.
